


Załącznik nr 15- Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

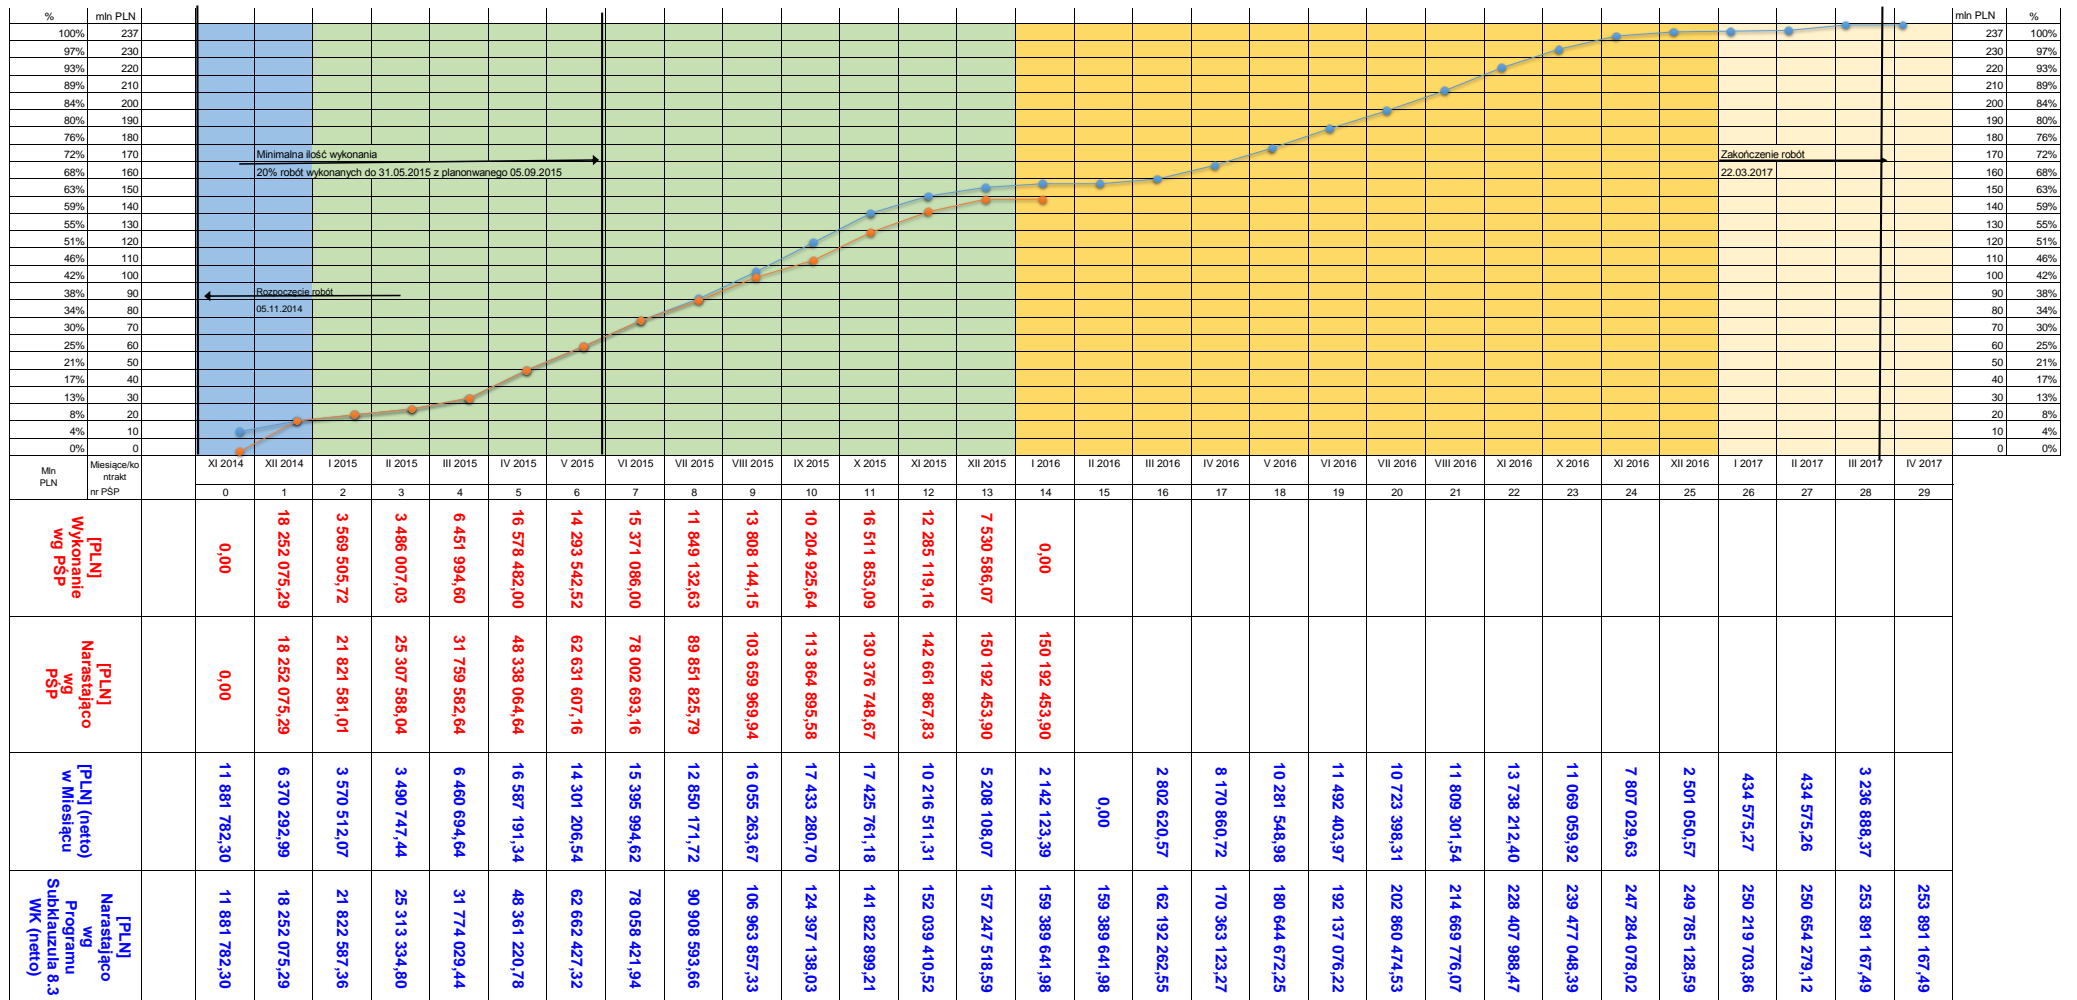

Legenda
 wartość wykonane i narastająco wg PŚP (netto)
 wartość zaplanowane i narastająco wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto)
 rok 2014
 rok 2015
 rok 2016
 rok 2017

W miesiącu grudniu 2014 podana wartość jest sumą zaliczki i wystąpienia Wykonawcy o płatność
 W miesiącu kwietniu 2015 podana wartość jest sumą PŚP nr 5 i PŚP nr 6

Zgodnie z aneksem nr 1 termin zakończenia robót został zmieniony na 22.03.2017.
 W dniu 18.06.2015 został zatwierdzony Program zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu, nr rev_6/05/2015, Program przerobu i płatności rev. z 23.07.2015.
 W dniu 31.05.2015 Wykonawca osiągnął Kamień Milowy, który został potwierdzony przez Inżyniera w dniu 23.06.2015 wystawieniem PŚP nr 7
