




ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Progress	Milestone	Task	Critical Task
1	AUTOSTRADA A1 TORUŃ - STRYKÓW - Zadanie I Odcinek 4.: Wezle Kowal - Wezle Sojki od km 215+850 do km 245+800 Harmonogram	Thu 08/07/10	Mon 30/04/12	378 days?				
4	Minimum wykonania zobowiązania	Mon 30/05/11	Mon 30/05/11	0 days				
5	Przeanalizowanie wyliczeń, specyfikacji, uzgodnień pozostawia, decyzji, umów, warunków i innych dokumentów Generalnemu Wykonawcy	Sat 07/08/10	Sat 28/04/12	353 days				
6	Wymagania ogólne	Thu 08/07/10	Mon 30/04/12	377.5 days				
7	SEKCJE A1.A2.B	Thu 08/07/10	Mon 30/04/12	377.5 days				
8	Wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych dla korekta	Mon 02/08/10	Fri 27/04/12	357 days				
9	Wykonanie tablic pamiatkowych po zakonczenu kontraktu	Sat 31/03/12	Mon 30/04/12	22 days				
10	Przewidy, objazdy, lymczasowa organizacja ruchu	Mon 02/08/10	Fri 27/04/12	357 days				
12	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	Thu 08/07/10	Fri 27/04/12	376 days				
13	Geodzyjnia i budowlana dokumentacja powykonawcza.	Sat 31/03/12	Mon 30/04/12	22 days				
15	Inwestycyjna, ocena stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, drog lymczasowych wyznaczonych przez Wykonawcę do transportu technologicznego dla budowy odcinka autostrady oraz wykonanie naprawy po okresie usypowania	Thu 08/07/10	Fri 27/04/12	376 days				
16	Monitoring dla studzi z wodą pliną, dodatkowych punktów obserwac	Mon 13/09/10	Fri 27/04/12	324 days				
18	Nadzór przyrodniczy	Tue 20/07/10	Thu 31/03/11	137 days				
19	SEKCJA C1.C2.D1.D2	Thu 08/07/10	Mon 30/04/12	377.5 days				
20	Koszt dostosowania się do wymagań Wzruszeń Kontraktu i Wyzna	Thu 08/07/10	Fri 27/04/12	376 days				
21	Wykonanie i dostarczenie kompletów map powykonawczych	Fri 18/03/12	Mon 30/04/12	34 days				
22	Wykonanie uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czasie budow	Thu 08/07/10	Fri 27/04/12	376 days				
23	Wybudowanie drogi lymczasowych oraz dodatkowych objazdow/przejazd	Fri 10/09/10	Fri 27/04/12	326 days				
24	Utrzymanie drogi lymczasowych, objazdow/przejazdów i organizacji	Fri 10/09/10	Fri 27/04/12	326 days				
25	Likwidacja drogi lymczasowych dodatkowych, objazdow/przejazdów	Fri 16/03/12	Mon 30/04/12	34 days				
26	Koszt czasowego zajęcia terenu dla robót poza liniami rozgr	Thu 08/09/10	Fri 27/04/12	327 days				
28	Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy	Mon 05/08/10	Fri 27/04/12	352 days				
29	Likwidacja Zaplecza Wykonawcy	Sat 31/03/12	Mon 30/04/12	22 days				
30	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i tablic pamiatkowych	Sat 31/03/12	Mon 30/04/12	22 days				
31	ROBOTY DROGOWE	Tue 31/08/10	Mon 30/04/12	335.5 days?				
32	A1 215 + 850 - 219 + 420	Wed 01/09/10	Mon 30/04/12	334.5 days?				
33	inne roboty A1	Wed 01/09/10	Fri 27/04/12	333 days				
34	odrumnowanie	Thu 08/09/10	Wed 30/03/11	34 days				
35	wykop	Wed 16/03/11	Sat 07/05/11	40 days				
36	nasyt	Mon 11/04/11	Sat 11/06/11	47.5 days				
37	nasyt zbrojony geotekstyliem	Mon 11/04/11	Tue 31/05/11	38.5 days				
38	umocnienie skarp rowow i kolekw + icznanie i luzephanie pobocz	Wed 01/09/11	Wed 31/08/11	70.5 days				
39	odwodnienie korpusu drogowego	Mon 18/04/11	Sat 30/07/11	79.5 days				
40	w-wa drenazowa	Mon 06/08/11	Thu 30/06/11	19.5 days				
41	w-wa odciążająca	Mon 13/06/11	Sat 23/07/11	32 days				
42	w-wa mrozochronna	Mon 01/08/11	Sat 06/08/11	5.5 days				
43	podbudowa lub ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cement	Mon 25/07/11	Sat 10/08/11	37.5 days				
44	podb. z kruszywa lamarnego	Mon 22/08/11	Sat 24/09/11	27.5 days				
45	podb. BA WMS 0/20	Mon 19/09/11	Sat 08/10/11	16.5 days				
46	w-wa wiązka 0/16	Sat 01/10/11	Mon 31/10/11	23.5 days				
47	SMA 0/11	Mon 24/10/11	Sat 05/11/11	10 days?				
48	urządzenia zabezpieczające ruch	Thu 06/10/11	Mon 16/04/12	76 days				
49	zeleń drogowa	Fri 02/09/11	Mon 30/04/12	84 days				
50	elementy ulic	Thu 01/09/11	Mon 30/04/12	82 days				
51	A2 219 + 420 - 224 + 340	Mon 06/09/10	Mon 30/04/12	331 days?				
52	inne roboty A2	Mon 06/09/10	Fri 27/04/12	330 days				
53	odrumnowanie	Tue 07/09/10	Tue 05/04/11	52 days				
54	wykop	Mon 04/10/10	Thu 12/05/11	64 days				
55	nasyt	Mon 21/03/11	Sat 09/07/11	85 days				
56	nasyt zbrojony geotekstyliem	Mon 21/03/11	Sat 14/05/11	42 days				
57	umocnienie skarp rowow i kolekw + icznanie i luzephanie pobocz	Fri 10/06/11	Sat 17/09/11	76 days				
58	odwodnienie korpusu drogowego	Fri 22/04/11	Sat 13/08/11	86 days				
59	w-wa drenazowa	Mon 11/07/11	Sat 30/07/11	16.5 days				
60	w-wa odciążająca	Mon 25/07/11	Fri 19/08/11	20 days				
61	w-wa mrozochronna	Sat 13/08/11	Mon 22/08/11	5.5 days				
62	podbudowa lub ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cement	Mon 08/08/11	Sat 10/09/11	26.5 days				
63	podb. z kruszywa lamarnego	Thu 01/09/11	Wed 14/08/11	11 days				
64	podb. BA WMS 0/20	Wed 14/09/11	Fri 14/10/11	25 days				
65	w-wa wiązka 0/16	Mon 10/10/11	Sat 05/11/11	21 days				
66	SMA 0/11	Mon 07/11/11	Mon 21/11/11	11 days				
67	urządzenia zabezpieczające ruch	Mon 10/10/11	Sat 14/04/12	73 days				
68	zeleń drogowa	Mon 12/09/11	Sat 28/04/12	94 days				
69	elementy ulic	Mon 12/09/11	Mon 30/04/12	104.5 days?				
70	B 224 + 340 - 230 + 817	Wed 01/09/10	Mon 30/04/12	334.5 days				
71	inne roboty B	Wed 01/09/10	Fri 27/04/12	333 days				
72	odrumnowanie	Mon 13/09/10	Thu 07/04/11	42 days				
73	wykop	Fri 01/04/11	Sat 16/04/11	12.5 days				
74	nasyt	Fri 01/04/11	Sat 11/06/11	54.5 days				
75	nasyt zbrojony geotekstyliem	Fri 01/04/11	Sat 04/08/11	49 days				
76	umocnienie skarp rowow i kolekw + icznanie i luzephanie pobocz	Mon 06/05/11	Sat 15/10/11	102.5 days				
77	odwodnienie korpusu drogowego	Mon 02/05/11	Sat 17/09/11	107 days				
78	w-wa drenazowa	Mon 06/05/11	Sat 18/06/11	11 days				
79	w-wa odciążająca	Mon 13/06/11	Sat 23/07/11	32 days				
80	w-wa mrozochronna	Mon 18/07/11	Sat 23/07/11	5.5 days				
81	podbudowa lub ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cement	Mon 25/07/11	Sat 10/08/11	37.5 days				
82	podb. z kruszywa lamarnego	Mon 22/08/11	Sat 24/09/11	27.5 days				
83	podb. BA WMS 0/20	Mon 12/09/11	Sat 15/10/11	27.5 days				
84	w-wa wiązka 0/16	Sat 01/10/11	Sat 05/11/11	27 days				
85	SMA 0/11	Wed 02/11/11	Sat 14/04/12	13.5 days				
86	urządzenia zabezpieczające ruch	Mon 17/10/11	Sat 14/04/12	67.5 days				
87	zeleń drogowa	Thu 01/09/11	Mon 30/04/12	88 days				
88	elementy ulic	Thu 01/09/11	Sat 28/04/12	101 days				
89	C1 230 + 817 - 234 + 450	Wed 01/09/10	Sat 28/04/12	334 days				
90	roboty przygotowawcze C1	Wed 01/09/10	Thu 26/04/12	332 days				
91	odrumnowanie	Thu 02/09/10	Fri 26/04/11	87 days				
92	wykop	Tue 26/04/11	Sat 07/05/11	9 days				
93	nasyt	Fri 29/10/10	Sat 30/07/11	75 days				

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2011	2012
					Jan	Feb
94	nasyp zbrojony geosytnetykiem i wzmocnienie podłoża	46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11	02/05	03/06
95	ulepzone podłoże	80.5 days	Mon 02/05/11	Sat 13/08/11	02/05	03/06
96	odwodnienie korpusu drogowego	83.5 days	Mon 16/05/11	Wed 31/08/11	03/05	03/06
97	w-wa mrozochronna	32 days	Mon 02/05/11	Sat 11/06/11	02/05	03/06
98	podł. z kruszywa łamanego	56.5 days	Mon 06/06/11	Sat 20/08/11	06/06	03/06
99	podł. BA WMS 020	40.5 days	Mon 11/07/11	Wed 31/08/11	11/07	03/06
100	w-wa wiązka 0'16	37.5 days	Mon 01/08/11	Sat 17/09/11	01/08	03/06
101	SMA 0'11 i ścieranka	24 days	Thu 01/09/11	Fri 30/09/11	01/09	03/06
102	wykończonowe	68.5 days	Mon 18/09/11	Sat 17/10/12	18/09	03/06
103	urządzenia bezpieczeństwa ruchu	73 days	Mon 10/10/11	Sat 26/04/12	10/10	03/06
104	zeleń drogową	75.5 days	Wed 05/10/11	Sat 26/04/12	05/10	03/06
105	elementy ulic	67 days	Mon 18/09/11	Wed 14/12/11	18/09	03/06
106	inne	61.5 days	Sat 01/10/11	Thu 26/04/12	01/10	03/06
107	C2 234 + 450 - 239 + 150	334 days	Wed 01/08/10	Sat 28/04/12	01/08	03/06
108	roboty przygotowawcze C2	333 days	Wed 01/08/10	Fri 27/04/12	01/08	03/06
109	odtłuszczenie	41 days	Fri 01/10/10	Thu 28/04/11	28/04	03/06
110	wykop	20 days	Tue 26/04/11	Sat 21/05/11	26/04	03/06
111	nasyp	46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11	02/05	03/06
112	nasyp zbrojony geosytnetykiem i wzmocnienie podłoża	32 days	Mon 02/05/11	Sat 11/06/11	02/05	03/06
113	ulepzone podłoże	53 days	Mon 02/05/11	Sat 09/07/11	02/05	03/06
114	odwodnienie korpusu drogowego	65 days	Mon 09/05/11	Sat 30/07/11	09/05	03/06
115	w-wa mrozochronna	26.5 days	Mon 23/05/11	Sat 25/06/11	23/05	03/06
116	podł. z kruszywa łamanego	26.5 days	Mon 20/06/11	Sat 23/07/11	20/06	03/06
117	podł. BA WMS 020	22 days	Mon 11/07/11	Sat 06/08/11	11/07	03/06
118	w-wa wiązka 0'16	26.5 days	Mon 01/08/11	Sat 03/09/11	01/08	03/06
119	SMA 0'11 i ścieranka	11 days	Mon 05/09/11	Sat 17/09/11	05/09	03/06
120	wykończonowe	85 days	Mon 12/09/11	Sat 31/03/12	12/09	03/06
121	urządzenia bezpieczeństwa ruchu	71 days	Mon 03/10/11	Sat 21/04/12	03/10	03/06
122	zeleń drogową	71.5 days	Mon 03/10/11	Sat 21/04/12	03/10	03/06
123	elementy ulic	99 days	Tue 20/09/11	Sat 26/04/12	20/09	03/06
124	inne roboty	88 days	Fri 30/09/11	Fri 27/04/12	30/09	03/06
125	D1 239 + 150 - 242 + 150	335 days	Tue 31/08/10	Sat 28/04/12	31/08	03/06
126	roboty przygotowawcze D1	335 days	Tue 31/08/10	Sat 28/04/12	31/08	03/06
127	odtłuszczenie	38.5 days	Tue 01/03/11	Sat 30/04/11	01/03	03/06
128	wykop	14.5 days	Mon 18/04/11	Sat 07/05/11	18/04	03/06
129	nasyp	63 days	Tue 26/04/11	Sat 16/07/11	26/04	03/06
130	nasyp zbrojony geosytnetykiem i wzmocnienie podłoża	20 days	Tue 26/04/11	Sat 21/05/11	26/04	03/06
131	ulepzone podłoże	68.5 days	Mon 02/05/11	Sat 30/07/11	02/05	03/06
132	odwodnienie korpusu drogowego	57.5 days	Wed 01/06/11	Sat 13/08/11	01/06	03/06
133	w-wa mrozochronna	18.5 days	Mon 05/05/11	Tue 31/05/11	05/05	03/06
134	podł. z kruszywa łamanego	52 days	Wed 01/06/11	Sat 06/08/11	01/06	03/06
135	podł. BA WMS 020	34.5 days	Fri 01/07/11	Sat 13/08/11	01/07	03/06
136	w-wa wiązka 0'16	29.5 days	Mon 25/07/11	Wed 31/08/11	25/07	03/06
137	SMA 0'11 i ścieranka	21 days	Tue 16/08/11	Sat 10/09/11	16/08	03/06
138	wykończonowe	82 days	Thu 01/09/11	Sat 17/03/12	01/09	03/06
139	urządzenia bezpieczeństwa ruchu	89 days	Mon 03/10/11	Sat 26/04/12	03/10	03/06
140	zeleń drogową	96 days	Thu 08/09/11	Fri 27/04/12	08/09	03/06
141	elementy ulic	78 days	Mon 03/10/11	Sat 14/04/12	03/10	03/06
142	inne roboty	90 days	Sat 01/10/11	Sat 28/04/12	01/10	03/06
143	D2 242 + 150 - 245 + 800	334 days	Wed 01/08/10	Mon 30/04/12	01/08	03/06
144	roboty przygotowawcze D2	332.5 days	Wed 01/08/10	Sat 31/03/12	01/08	03/06
145	odtłuszczenie	31 days	Tue 01/03/11	Wed 20/04/11	01/03	03/06
146	wykop	47.5 days	Mon 11/04/11	Sat 11/06/11	11/04	03/06
147	nasyp	26.5 days	Mon 06/06/11	Sat 09/07/11	06/06	03/06
148	nasyp zbrojony geosytnetykiem i wzmocnienie podłoża	26.5 days	Mon 06/06/11	Sat 09/07/11	06/06	03/06
149	ulepzone podłoże	43 days	Mon 23/05/11	Sat 16/07/11	23/05	03/06
150	odwodnienie korpusu drogowego	59.5 days	Mon 16/05/11	Sat 30/07/11	16/05	03/06
151	w-wa mrozochronna	14.5 days	Wed 01/06/11	Sat 18/06/11	01/06	03/06
152	podł. z kruszywa łamanego	27 days	Sat 18/06/11	Sat 23/07/11	18/06	03/06
153	podł. BA WMS 020	16.5 days	Mon 25/07/11	Sat 13/08/11	25/07	03/06
154	w-wa wiązka 0'16	26.5 days	Mon 08/09/11	Sat 10/09/11	08/09	03/06
155	SMA 0'11 i ścieranka	11 days	Mon 05/09/11	Sat 17/09/11	05/09	03/06
156	wykończonowe	79.5 days	Mon 12/09/11	Fri 23/03/12	12/09	03/06
157	urządzenia bezpieczeństwa ruchu	86.5 days	Thu 01/09/11	Fri 20/04/12	01/09	03/06
158	zeleń drogową	88.5 days	Mon 12/09/11	Sat 21/04/12	12/09	03/06
159	elementy ulic	95 days	Mon 12/09/11	Mon 30/04/12	12/09	03/06
160	inne roboty	100.5 days	Mon 18/09/11	Mon 30/04/12	18/09	03/06
161	ROBOTY MOSTOWE	338 days	Fri 27/08/10	Mon 30/04/12	27/08	03/06
162	WD-181A	198 days	Wed 16/03/11	Wed 30/11/11	16/03	03/06
163	kolomy DSM	31 days	Wed 16/03/11	Sat 23/04/11	16/03	03/06
164	fundamentowanie	26.5 days	Mon 02/05/11	Sat 04/06/11	02/05	03/06
165	korpusy	46.5 days	Wed 01/06/11	Sat 30/07/11	01/06	03/06
166	pyła, izobacja, krawężniki, kapy	70.5 days	Mon 25/07/11	Sat 22/10/11	25/07	03/06
167	roboty wykończonowe	34 days	Sat 15/10/11	Wed 30/11/11	15/10	03/06
168	WD-181	178 days	Mon 11/04/11	Wed 30/11/11	11/04	03/06
169	fundamentowanie	31 days	Mon 11/04/11	Sat 21/05/11	11/04	03/06
170	korpusy	54 days	Mon 23/05/11	Sat 30/07/11	23/05	03/06
171	pyła, izobacja, krawężniki, kapy	76 days	Mon 18/07/11	Sat 22/10/11	18/07	03/06
172	roboty wykończonowe	34 days	Sat 15/10/11	Wed 30/11/11	15/10	03/06
173	WD-181B	178 days	Mon 11/04/11	Wed 30/11/11	11/04	03/06
174	fundamentowanie	31 days	Mon 11/04/11	Sat 21/05/11	11/04	03/06
175	korpusy	54 days	Mon 23/05/11	Sat 30/07/11	23/05	03/06
176	pyła, izobacja, krawężniki, kapy	76 days	Mon 18/07/11	Sat 22/10/11	18/07	03/06
177	roboty wykończonowe	34 days	Sat 15/10/11	Wed 30/11/11	15/10	03/06
178	WD-182	291.5 days	Fri 27/08/10	Wed 30/11/11	27/08	03/06
179	fundamentowanie	33 days	Fri 27/08/10	Sat 30/04/11	27/08	03/06
180	korpusy	57.5 days	Tue 26/04/11	Sat 09/07/11	26/04	03/06
181	pyła, izobacja, krawężniki, kapy	83 days	Fri 01/07/11	Sat 15/10/11	01/07	03/06
182	roboty wykończonowe	38.5 days	Sat 08/10/11	Wed 30/11/11	08/10	03/06
183	WD-182A	212.5 days	Mon 25/10/10	Fri 14/10/11	25/10	03/06
184	fundamentowanie	14.5 days	Mon 25/10/10	Sat 13/11/10	25/10	03/06
185	korpusy	38.5 days	Wed 01/12/10	Tue 31/05/11	01/12	03/06
186	pyła, izobacja, krawężniki, kapy	76 days	Mon 23/05/11	Wed 31/08/11	23/05	03/06
187	roboty wykończonowe	44 days	Sat 20/08/11	Fri 14/10/11	20/08	03/06
188	WD-183	259 days	Fri 01/10/10	Thu 10/11/11	01/10	03/06
189	fundamentowanie	30 days	Fri 01/10/10	Sat 23/04/11	01/10	03/06

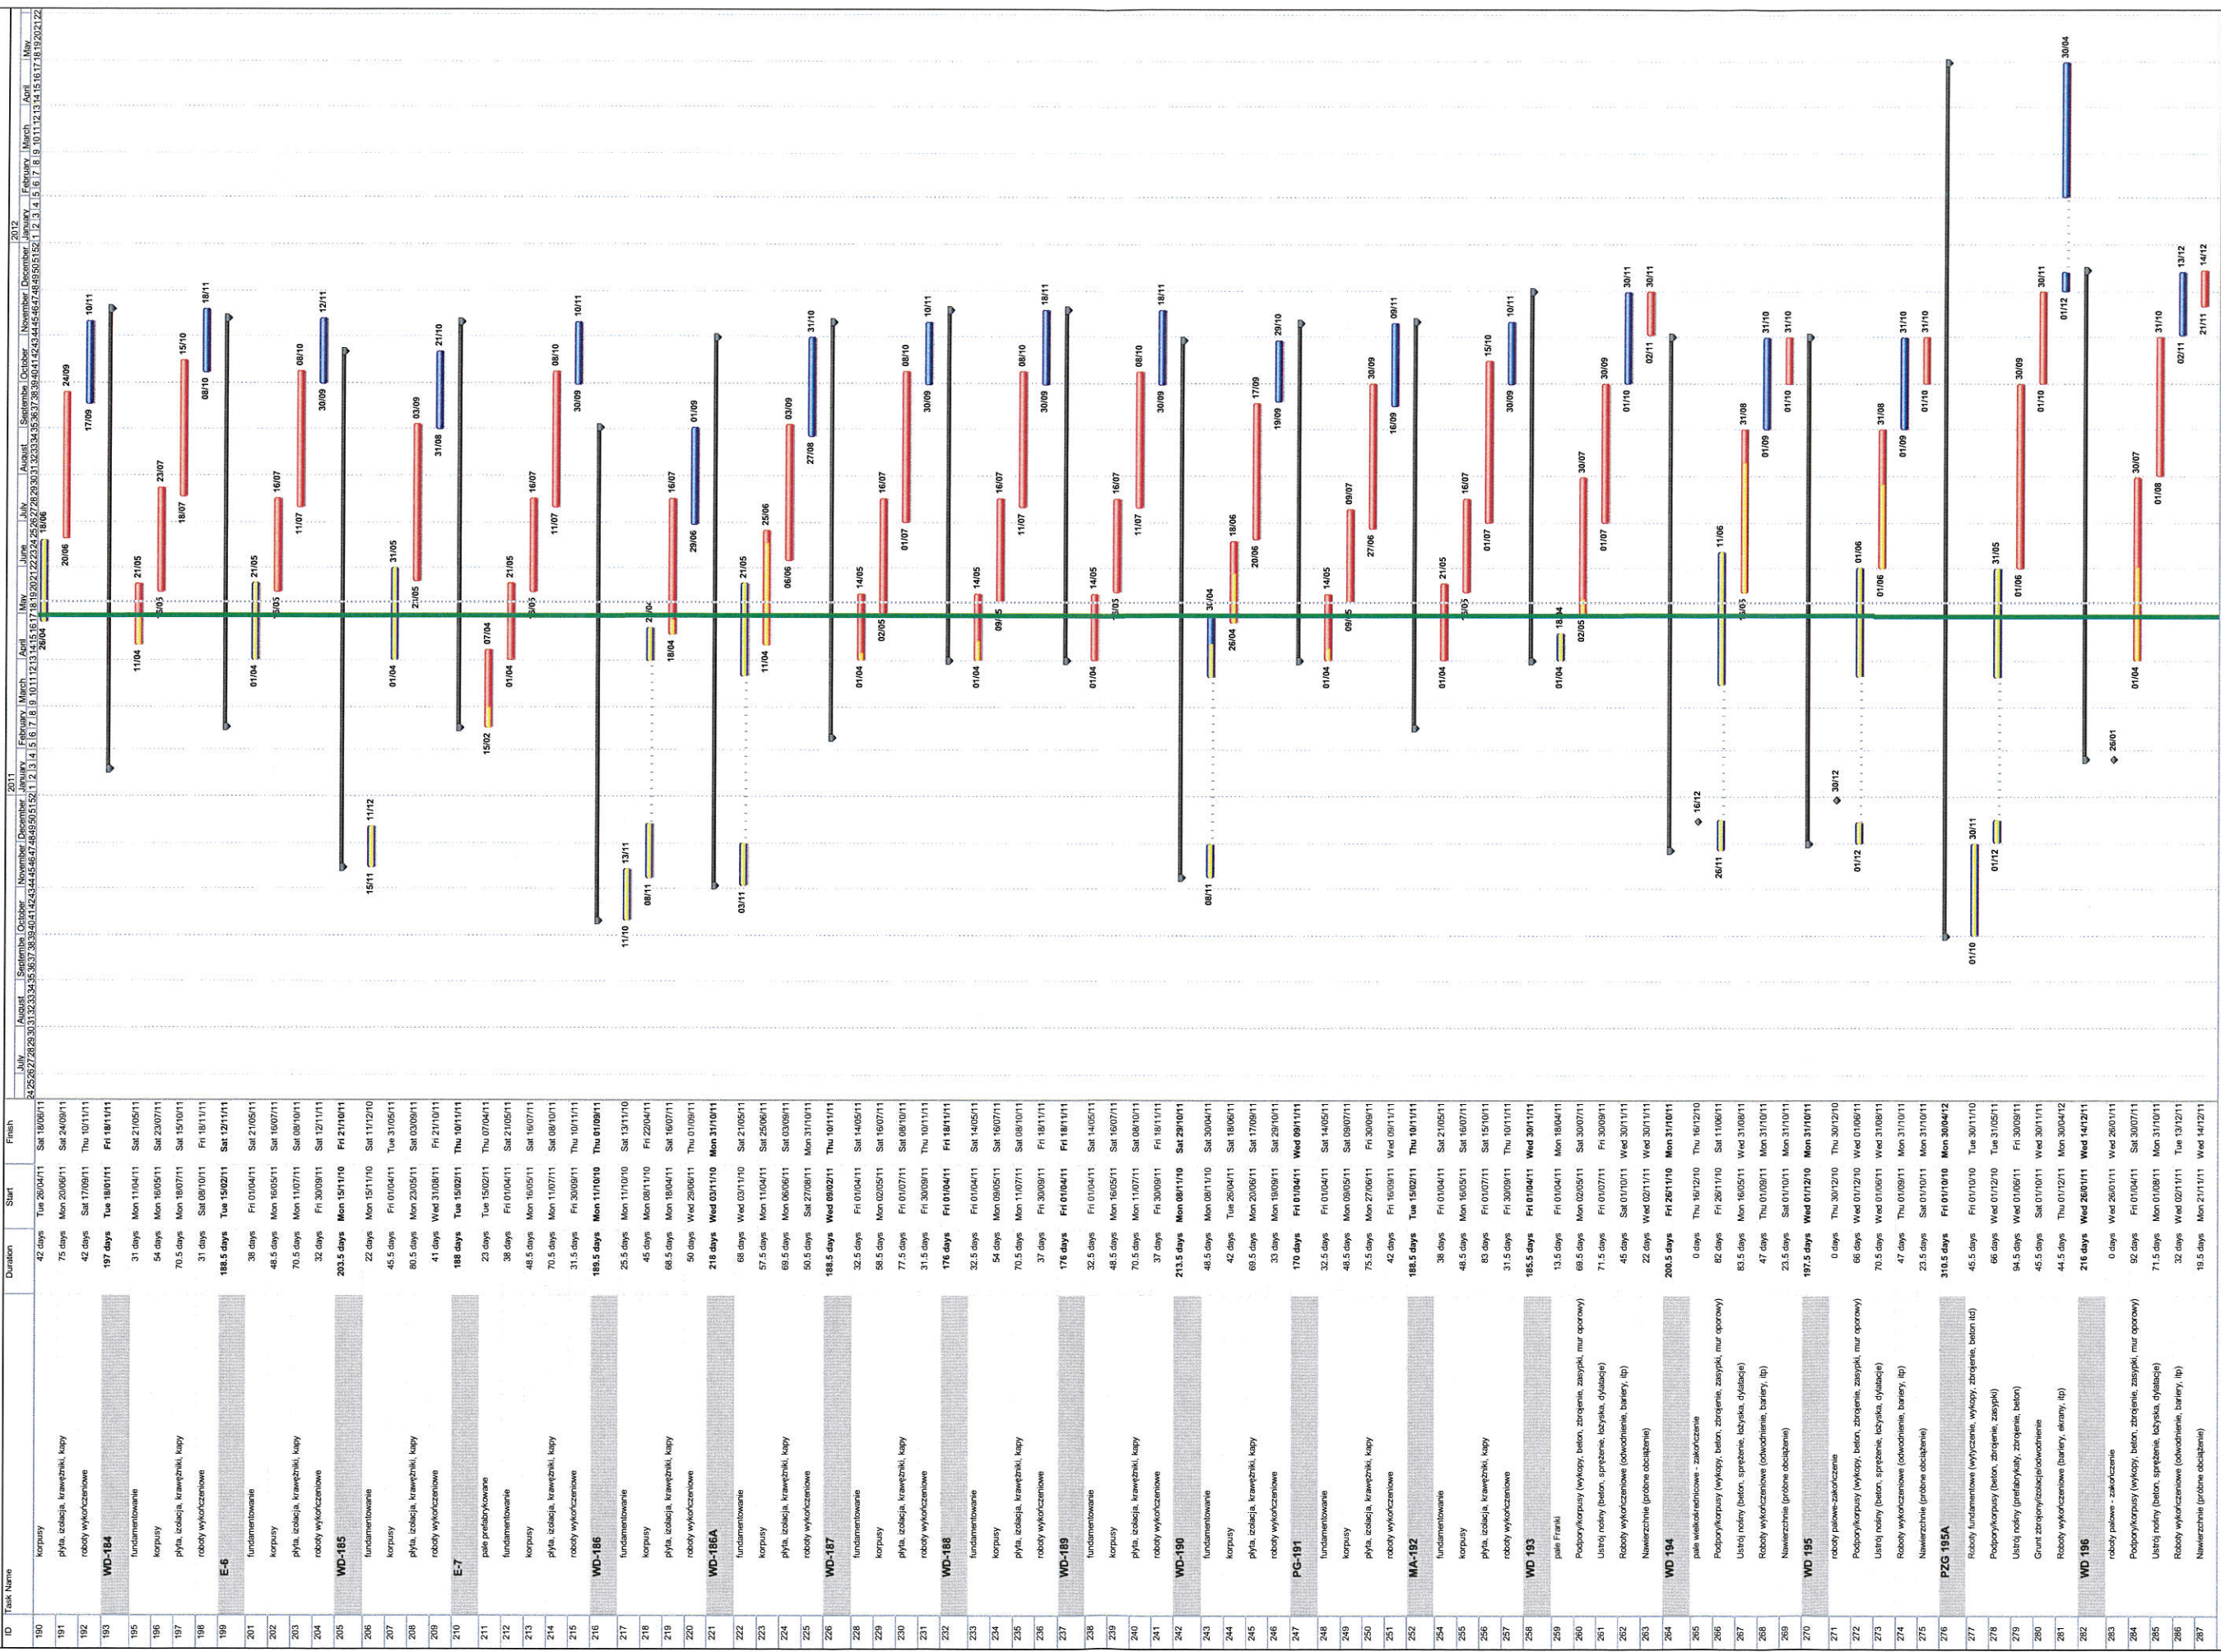

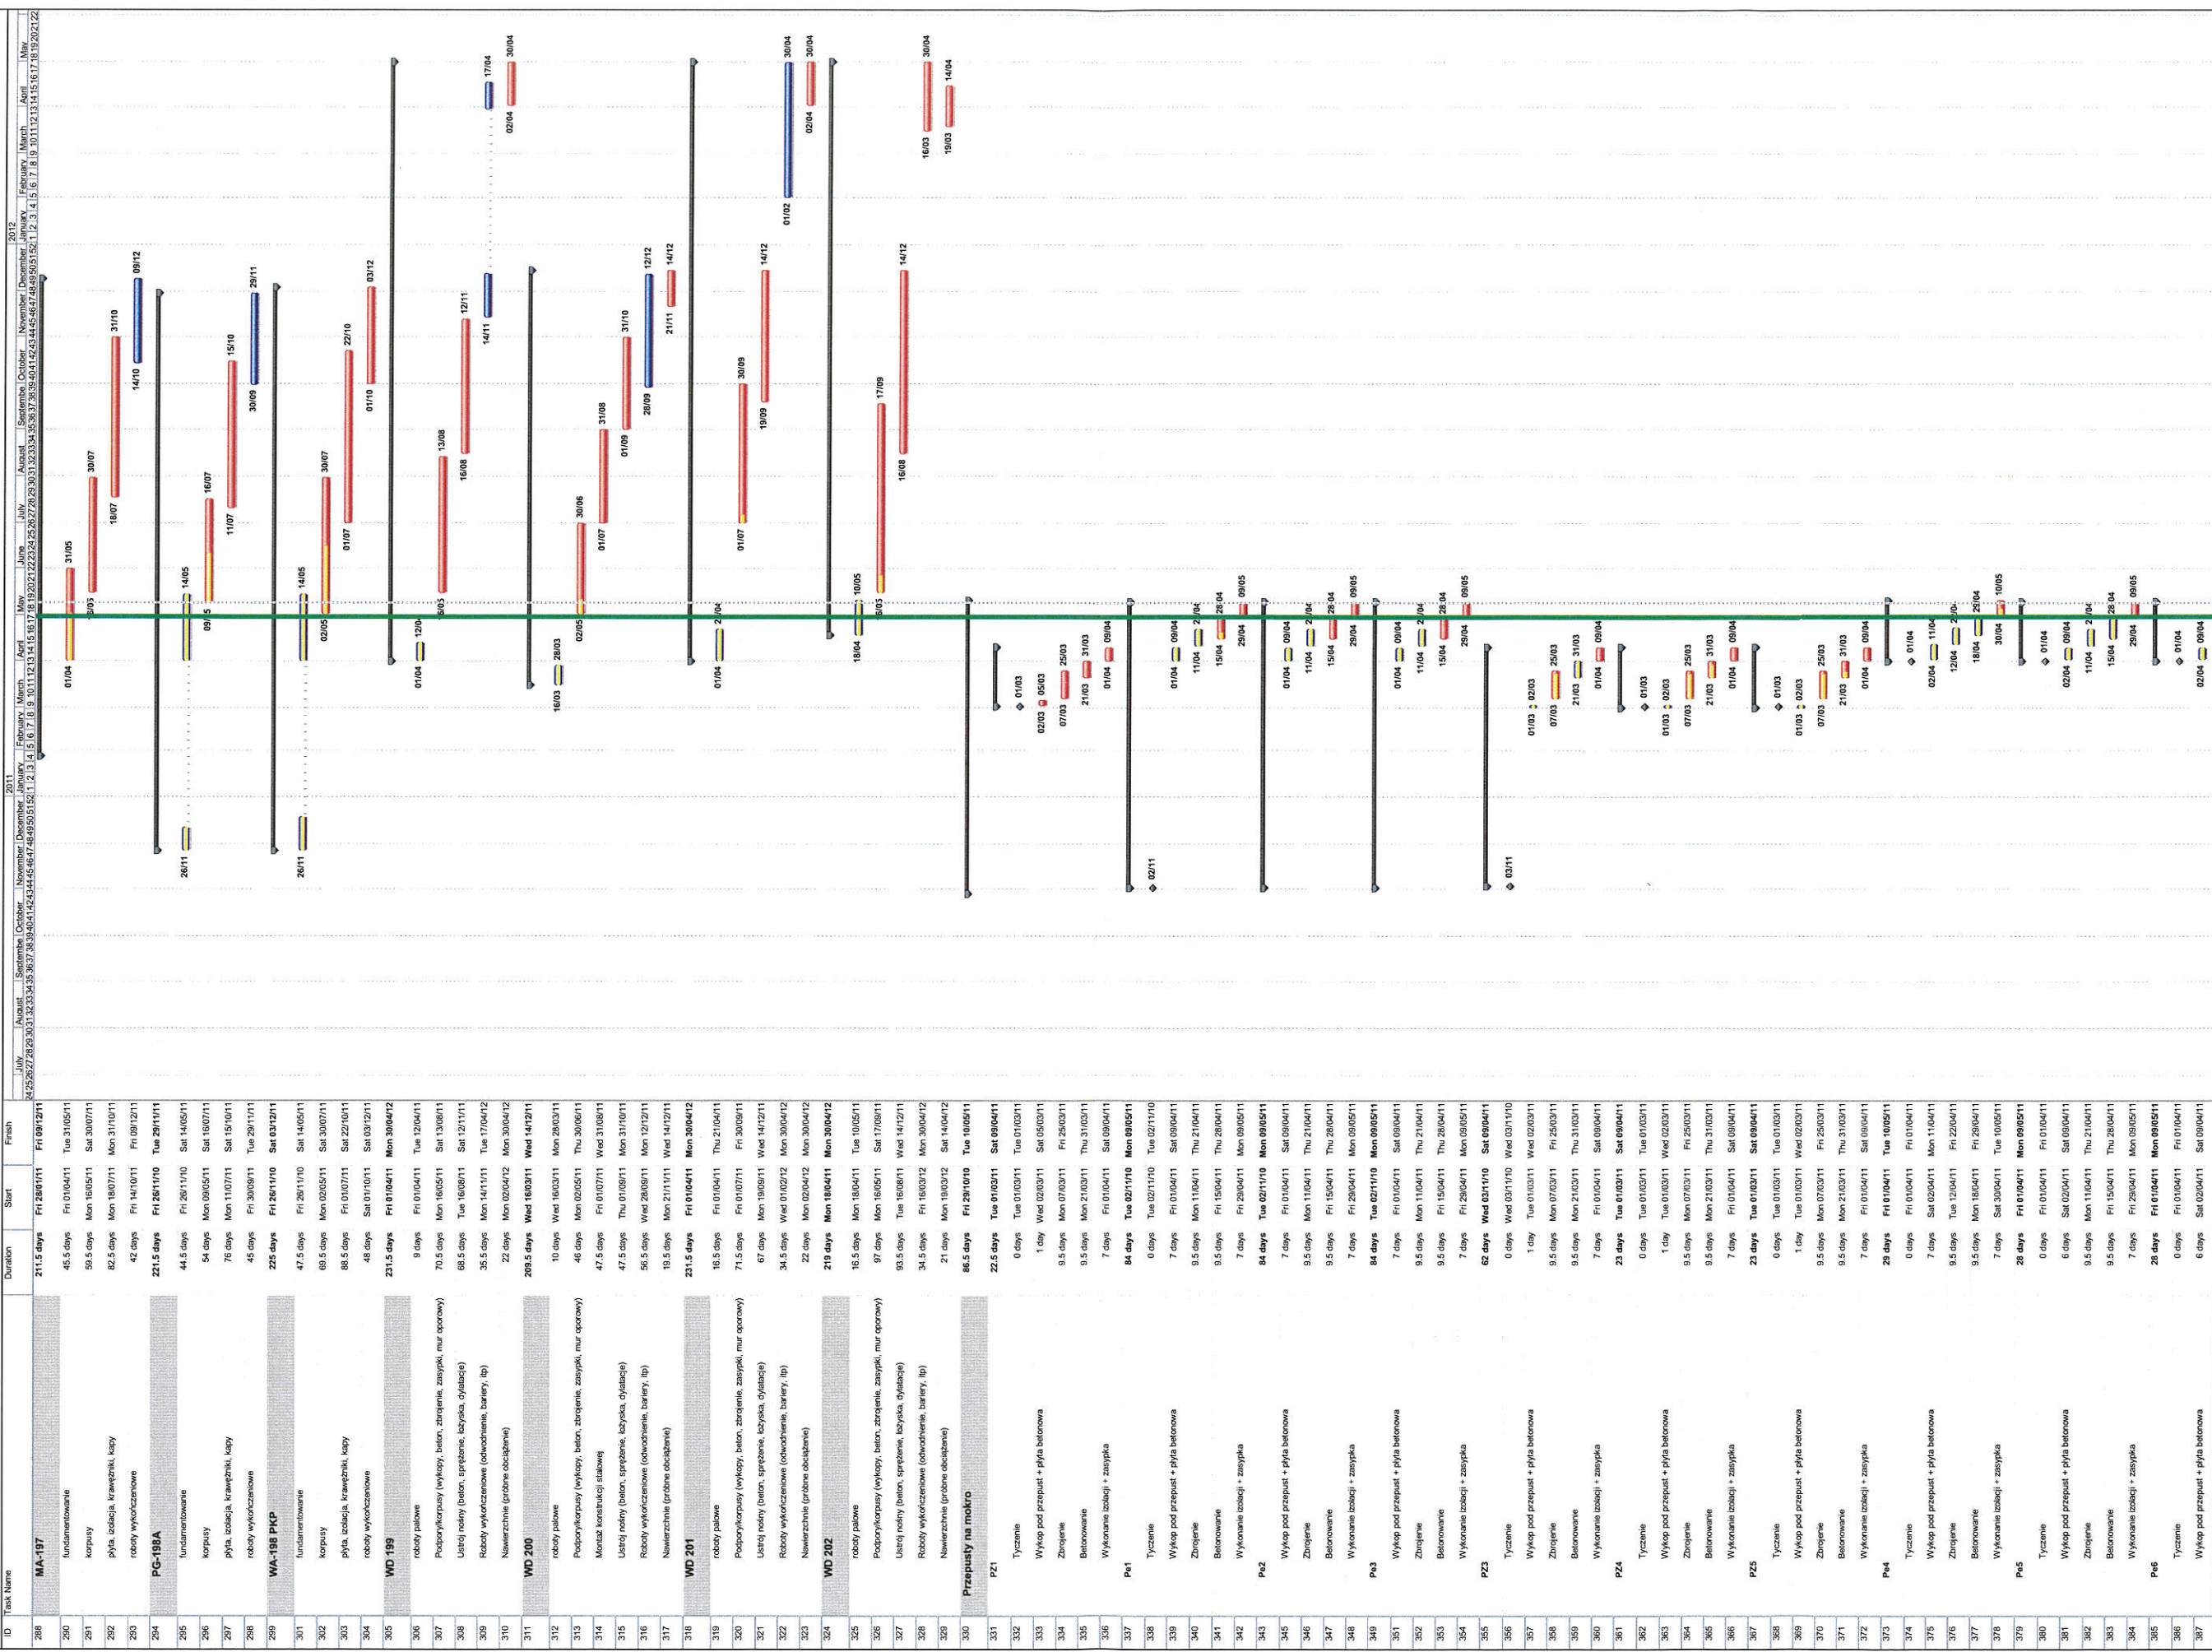

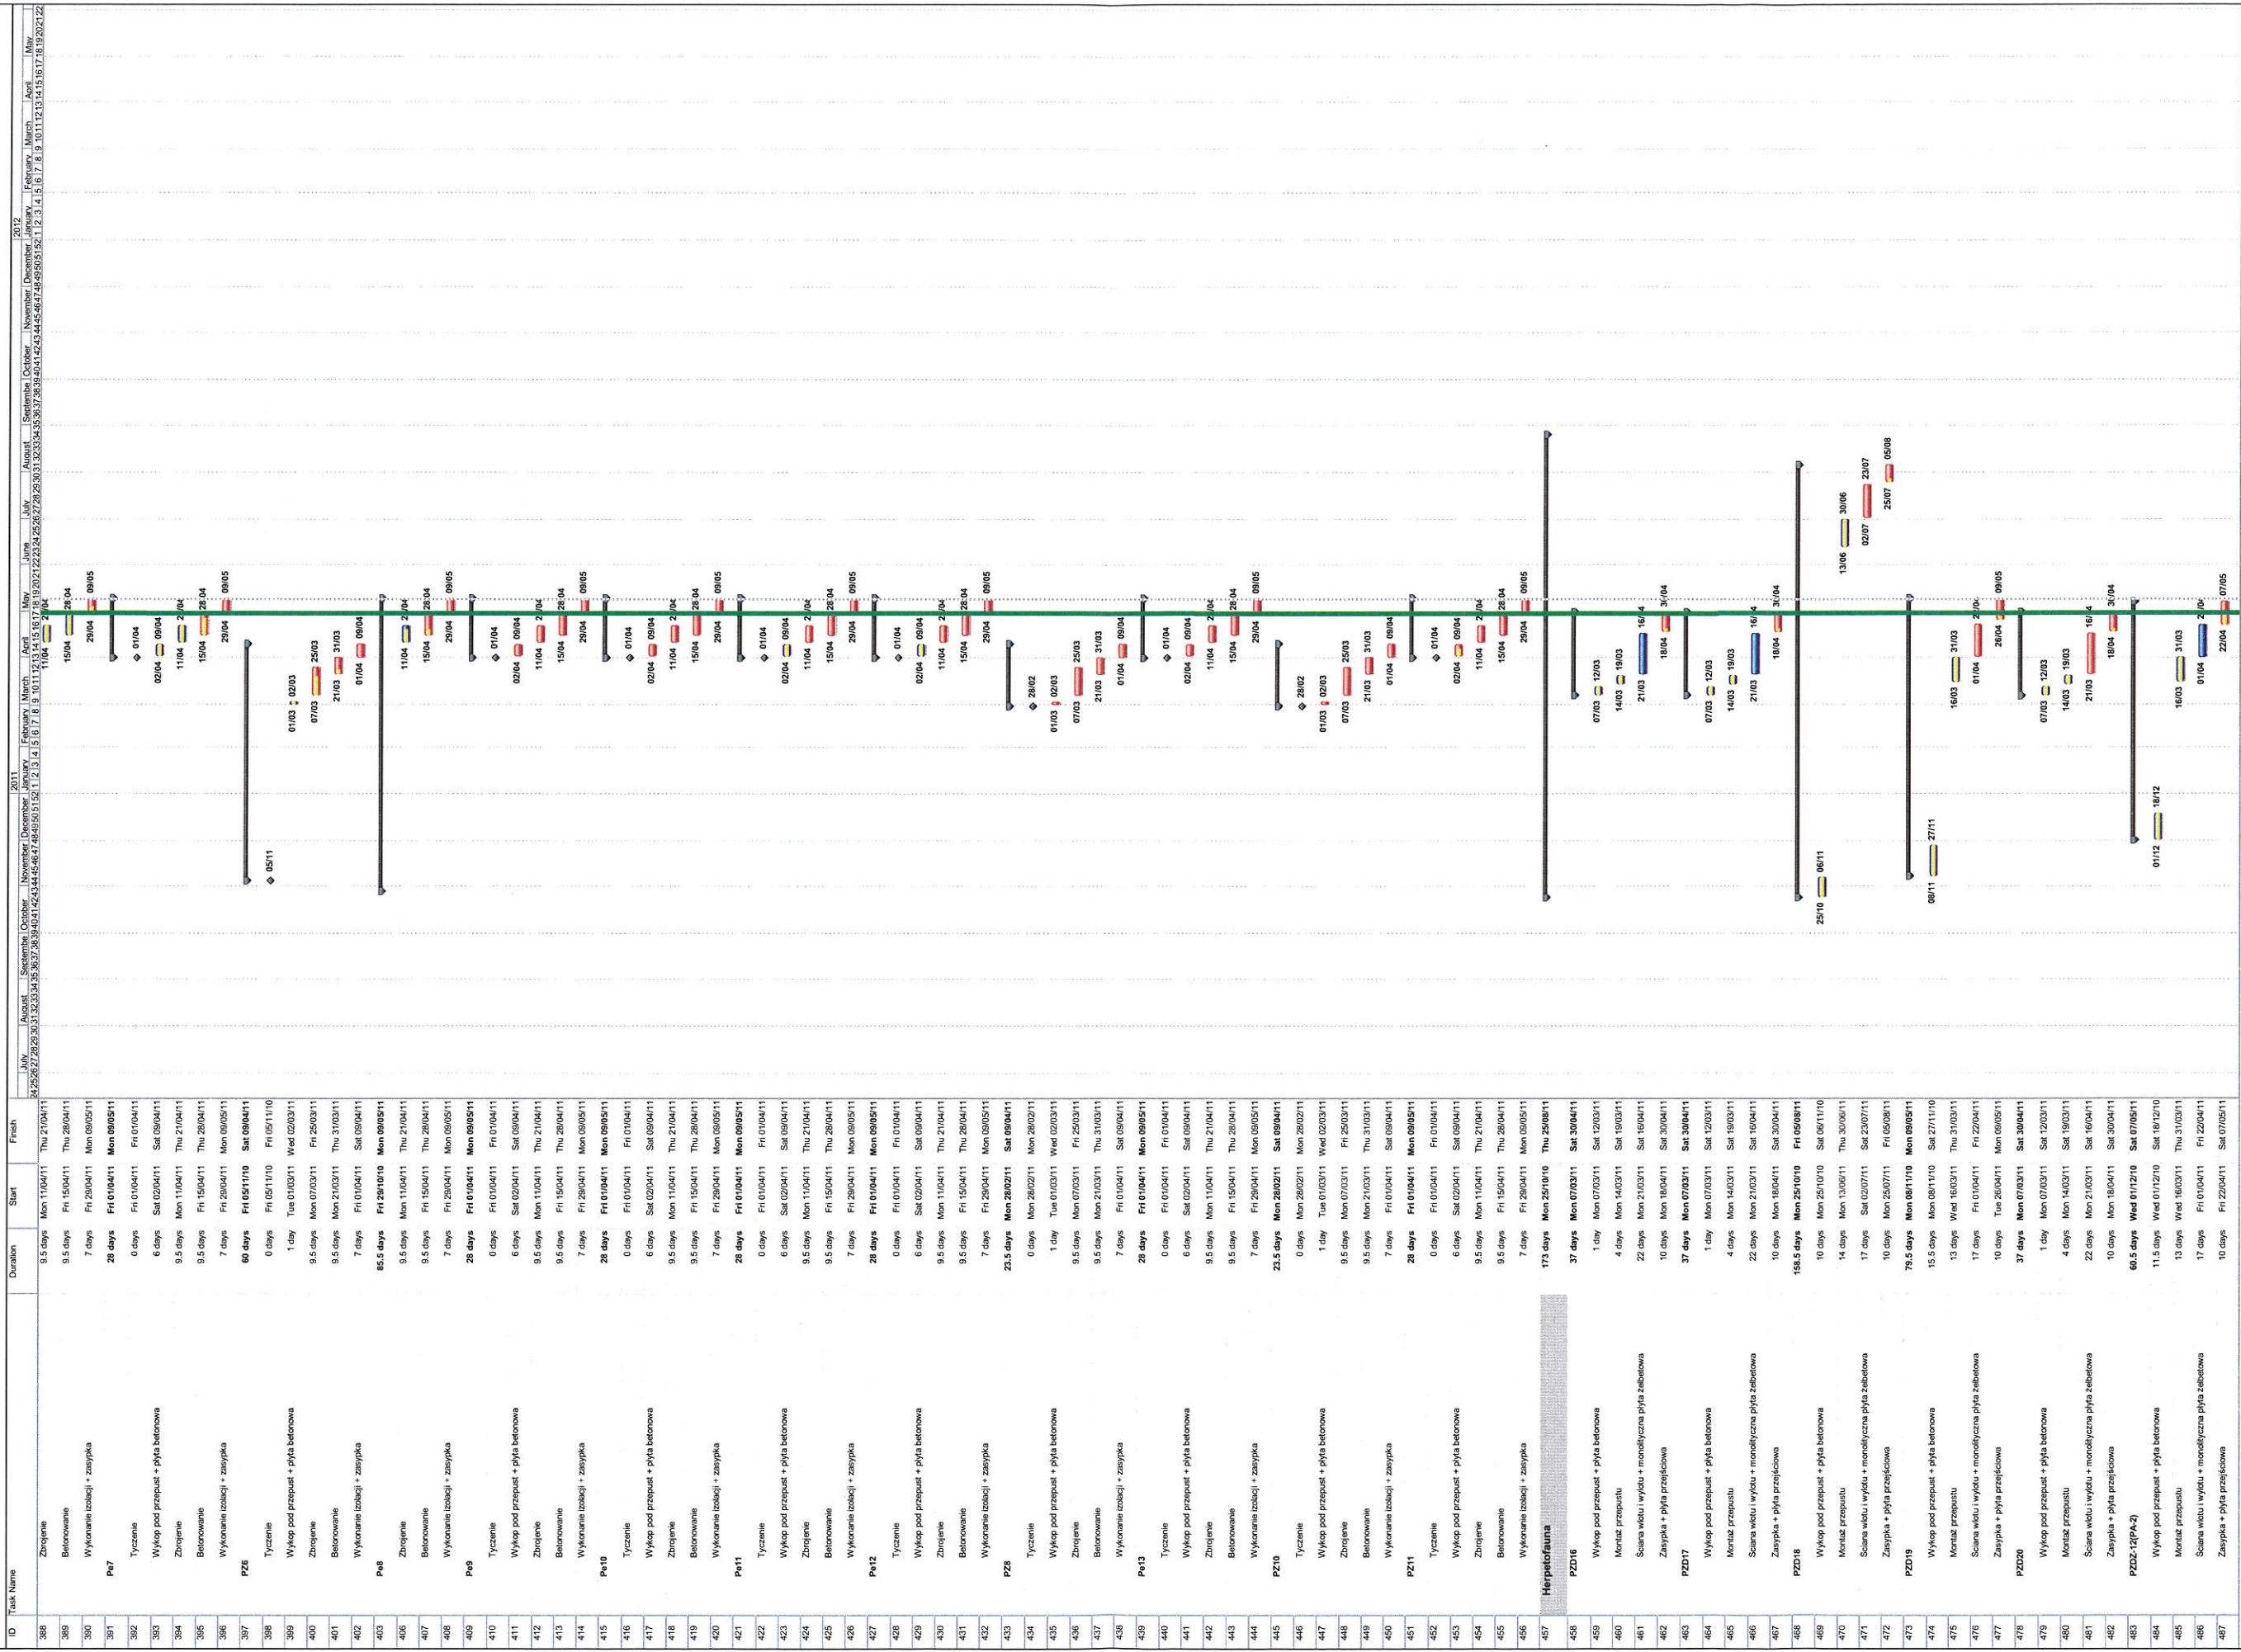

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2011	2012
					Jan	Feb
488	PZD21	43.5 days	Tue 18/07/11	Sat 30/04/11	18/01	22/01
489	Wykop pod przepust + płyta betonowa	1.5 days	Tue 18/07/11	Sat 22/07/11		
490	Montaż przepustu	9 days	Wed 18/03/11	Sat 26/03/11		
491	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	16.5 days	Mon 28/03/11	Sat 16/04/11		
492	Zasyпка + płyta przejściowa	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
493	PZDZ-18(PA-3)	46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
494	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4.5 days	Mon 02/05/11	Sat 07/05/11		
495	Montaż przepustu	4 days	Tue 17/05/11	Sat 21/05/11		
496	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	8 days	Mon 20/05/11	Thu 30/05/11		
497	Zasyпка + płyta przejściowa	46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
498	PZDZ-16(PA-4)	4.5 days	Mon 02/05/11	Sat 07/05/11		
499	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Tue 17/05/11	Sat 21/05/11		
500	Montaż przepustu	22 days	Mon 20/05/11	Sat 18/06/11		
501	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	8 days	Mon 20/05/11	Thu 30/05/11		
502	Zasyпка + płyta przejściowa	43 days	Fri 01/07/11	Thu 25/08/11		
503	PZDZ2	4.5 days	Fri 01/07/11	Wed 06/07/11		
504	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Tue 12/07/11	Sat 16/07/11		
505	Montaż przepustu	22 days	Mon 18/07/11	Sat 13/08/11		
506	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	8 days	Tue 18/08/11	Thu 25/08/11		
507	Zasyпка + płyta przejściowa	43 days	Fri 01/07/11	Thu 25/08/11		
508	PZDZ3	4.5 days	Fri 01/07/11	Wed 06/07/11		
509	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Tue 12/07/11	Sat 16/07/11		
510	Montaż przepustu	22 days	Mon 18/07/11	Sat 13/08/11		
511	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	8 days	Tue 18/08/11	Thu 25/08/11		
512	Zasyпка + płyta przejściowa	37 days	Mon 07/03/11	Sat 30/04/11		
513	PZDZ-15(PA-5)	1 day	Mon 07/03/11	Sat 12/03/11		
514	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Mon 14/03/11	Sat 19/03/11		
515	Montaż przepustu	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
516	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
517	Zasyпка + płyta przejściowa	1 day	Mon 21/02/11	Mon 28/02/11		
518	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Wed 02/03/11	Thu 17/03/11		
519	Montaż przepustu	17.5 days	Fri 18/03/11	Fri 08/04/11		
520	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	37 days	Mon 07/03/11	Sat 30/04/11		
521	Zasyпка + płyta przejściowa	1 day	Mon 07/03/11	Sat 12/03/11		
522	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Mon 14/03/11	Sat 19/03/11		
523	Montaż przepustu	22 days	Mon 21/03/11	Sat 16/04/11		
524	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
525	Zasyпка + płyta przejściowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
526	PZDZ-16(PA-6)	1 day	Mon 21/02/11	Mon 28/02/11		
527	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Wed 02/03/11	Thu 17/03/11		
528	Montaż przepustu	17.5 days	Fri 18/03/11	Fri 08/04/11		
529	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
530	Zasyпка + płyta przejściowa	68.5 days	Mon 15/11/10	Sat 30/04/11		
531	PZDZ7	13 days	Mon 15/11/10	Tue 30/11/10		
532	Wykop pod przepust + płyta betonowa	9 days	Wed 18/03/11	Sat 26/03/11		
533	Montaż przepustu	16.5 days	Mon 28/03/11	Sat 16/04/11		
534	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
535	Zasyпка + płyta przejściowa	42.5 days	Mon 07/03/11	Mon 09/05/11		
536	PZDZ-17(PA-7)	1 day	Mon 07/03/11	Sat 12/03/11		
537	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Tue 22/03/11	Sat 26/03/11		
538	Montaż przepustu	22 days	Mon 28/03/11	Sat 23/04/11		
539	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Tue 26/04/11	Mon 09/05/11		
540	Zasyпка + płyta przejściowa	37 days	Mon 07/03/11	Sat 30/04/11		
541	PZDZ8	1 day	Mon 07/03/11	Sat 12/03/11		
542	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Mon 14/03/11	Sat 19/03/11		
543	Montaż przepustu	22 days	Mon 21/03/11	Sat 16/04/11		
544	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Mon 18/04/11	Sat 30/04/11		
545	Zasyпка + płyta przejściowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
546	PZDZ-18(PA-8)	1 day	Mon 21/02/11	Mon 28/02/11		
547	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Wed 02/03/11	Thu 17/03/11		
548	Montaż przepustu	17.5 days	Fri 18/03/11	Fri 08/04/11		
549	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Sat 09/04/11	Thu 21/04/11		
550	Zasyпка + płyta przejściowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
551	PZDZ-19(PA-9)	1 day	Mon 21/02/11	Mon 28/02/11		
552	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Wed 02/03/11	Thu 17/03/11		
553	Montaż przepustu	17.5 days	Fri 18/03/11	Fri 08/04/11		
554	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Sat 09/04/11	Thu 21/04/11		
555	Zasyпка + płyta przejściowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
556	PZDZ-20(PA-10)	1 day	Mon 21/02/11	Mon 28/02/11		
557	Wykop pod przepust + płyta betonowa	4 days	Wed 02/03/11	Thu 17/03/11		
558	Montaż przepustu	17.5 days	Fri 18/03/11	Fri 08/04/11		
559	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Sat 09/04/11	Thu 21/04/11		
560	Zasyпка + płyta przejściowa	33.5 days	Mon 21/02/11	Thu 21/04/11		
561	PA-11	1.5 days	Tue 01/03/11	Sat 05/03/11		
562	Wykop pod przepust + płyta betonowa	1 day	Mon 07/03/11	Sat 12/03/11		
563	Montaż przepustu	20.5 days	Mon 14/03/11	Sat 09/04/11		
564	Sciana wióru i wyłotu + monolityczna płyta zabetonowa	10 days	Mon 11/04/11	Fri 22/04/11		
565	Zasyпка + płyta przejściowa	26.5 days	Mon 18/07/11	Sat 20/08/11		
566	Sałatka ogólnozakładowa	365.88 days?	Thu 08/07/10	Sat 14/04/12		
567	ROBOTY BRANŻOWE	219.5 days	Fri 01/04/11	Sat 14/04/12		
568	fundamenty	54.5 days	Fri 01/04/11	Sat 11/06/11		
569	budynki i zadaszenia	136.5 days	Mon 06/05/11	Wed 30/11/11		
570	numerowanie, wyszy kołki	54 days	Mon 06/05/11	Sat 13/08/11		
571	instalacje, roboty paszalone	97 days	Mon 13/06/11	Sat 15/10/11		
572	dotowanie urządzeń, testy, przekazanie	42 days	Mon 21/11/11	Sat 14/04/12		
573	MOP Lubień	156.5 days	Mon 11/04/11	Mon 31/01/11		
574	roboty ziemne, pobozowy	85 days	Mon 11/04/11	Sat 30/07/11		
575	numerowanie	11 days	Mon 01/08/11	Sat 13/08/11		
576	instalacje wod-kan oświetlenie	60.5 days	Mon 03/05/11	Sat 20/08/11		

Project: POSTĘP ROBOT DO RAPOR
 Date: Mon 08/05/11

Legend:
 Progress Milestone
 Summary Milestone
 Rollover Milestone
 Rollover Critical Task
 Rollover Task
 Rollover Progress
 Rollover Summary
 External Tasks
 Project Summary
 Group By Summary
 Deadline

Page 6

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2011	2012
					Jan	Feb
585	roboty wykończeniowe nasazenia	66 days	Mon 08/08/11	Mon 31/10/11		
586		60.5 days	Tue 16/08/11	Mon 31/10/11		
587	MOP „STRZELCE”	156.5 days	Mon 11/04/11	Mon 31/10/11		
588	roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbitowy nawierzchnie	20 days	Mon 16/04/11	Sat 14/05/11		
589		85 days	Mon 11/04/11	Sat 30/07/11		
590	nawierzchnie	11 days	Mon 01/08/11	Sat 13/08/11		
591	instalacje wod-kum okwieślenie	80.5 days	Mon 09/05/11	Sat 20/09/11		
592	roboty wykończeniowe	66 days	Mon 08/08/11	Mon 31/10/11		
593	SPO „SÓJKI”	219.5 days	Fri 01/04/11	Sat 14/04/12		
594	fundamenty	54.5 days	Fri 01/04/11	Sat 11/06/11		
595	budynki, zadzielenie	136.5 days	Mon 06/06/11	Wed 30/11/11		
596	nawierzchnie, wytypy lozki	54 days	Mon 06/06/11	Sat 13/08/11		
597	instalacje, roboty posobale	97 days	Mon 13/06/11	Sat 15/10/11		
598	dotawie urzadzzeń, listy, przekazanie	42 days	Mon 21/11/11	Sat 14/04/12		
599	Przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV	153 days	Wed 16/03/11	Fri 30/09/11		
600	zamówienia materiałów	35.5 days	Wed 16/03/11	Sat 30/04/11		
601	wykonanie sieci	80.5 days	Mon 02/05/11	Sat 13/08/11		
602	przełączenia	21 days	Tue 16/06/11	Sat 10/09/11		
603	odbiory, przekazanie	16 days	Mon 12/09/11	Fri 30/09/11		
604	Przebudowa sieci wysokiego napięcia 220kV	153 days	Wed 16/03/11	Fri 30/09/11		
605	zamówienia materiałów	35.5 days	Wed 16/03/11	Sat 30/04/11		
606	wykonanie sieci	80.5 days	Mon 02/05/11	Sat 13/08/11		
607	przełączenia	21 days	Tue 16/06/11	Sat 10/09/11		
608	odbiory, przekazanie	16 days	Mon 12/09/11	Fri 30/09/11		
609	Wzłem –KOWAL” od km 215+850 do km 230+817	171.5 days	Fri 01/10/10	Sat 30/07/11		
610	Przebudowa wodociągów - 215+850 do 230+817	171.5 days	Fri 01/10/10	Sat 30/07/11		
611	215-850	23.5 days	Fri 01/10/10	Sat 30/10/10		
612	217-800	25.5 days	Wed 16/03/11	Sat 16/04/11		
613	217-800	22 days	Tue 02/11/10	Tue 30/11/10		
614	219-200	22 days	Tue 02/11/10	Tue 30/11/10		
615	219-900	25.5 days	Wed 16/03/11	Sat 16/04/11		
616	221-400	46.5 days	Tue 16/11/10	Sat 16/04/11		
617	222-350	23 days	Mon 02/05/11	Tue 31/05/11		
618	223-000	22.5 days	Fri 01/04/11	Sat 30/04/11		
619	α-DD-423	22.5 days	Fri 01/04/11	Sat 30/04/11		
620	226-100	45.5 days	Wed 16/03/11	Sat 14/05/11		
621	226-250	23 days	Mon 02/05/11	Tue 31/05/11		
622	226-940	23 days	Wed 10/06/11	Thu 30/06/11		
623	226-950	23.5 days	Fri 01/07/11	Sat 30/07/11		
624	226-100	23 days	Wed 10/06/11	Thu 30/06/11		
625	226-200	23 days	Wed 10/06/11	Thu 30/06/11		
626	226-500	46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
627	Wzłem „SÓJKI” od km 230+817 do km 245+800	163.5 days	Fri 01/04/11	Mon 31/10/11		
628	Przebudowa wodociągów - 230+817 do 245+800	163.5 days	Fri 01/04/11	Mon 31/10/11		
629	231-642	22.5 days	Fri 01/04/11	Sat 30/04/11		
630	233-347	22.5 days	Fri 01/04/11	Sat 30/04/11		
631	234-900	23 days	Mon 02/05/11	Tue 31/05/11		
632	240-550	23 days	Wed 10/06/11	Thu 30/06/11		
633	242-550	23.5 days	Fri 01/07/11	Sat 30/07/11		
634	245-100	24 days	Thu 30/06/11	Sat 30/07/11		
635	236-640	95 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
636	236-500	72 days	Sat 30/07/11	Mon 31/10/11		
637	244-800	24 days	Mon 01/08/11	Wed 31/08/11		
638	Wzłem –KOWAL” od km 215+850 do km 230+817	196.5 days	Fri 01/04/11	Wed 14/12/11		
639	Kanalizacja deszczowa - 215+850 do 230+817	196.5 days	Fri 01/04/11	Wed 14/12/11		
640	od km 215+900 do 216-200	68.5 days	Fri 01/04/11	Thu 30/06/11		
641	od km 216-800 do 217-800	116 days	Fri 01/04/11	Wed 31/08/11		
642	od km 217-800 do 218-500	46.5 days	Wed 01/06/11	Sat 30/07/11		
643	od km 218-500 do 219-100	95 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
644	od km 219-200 do 220+100	80.5 days	Thu 01/09/11	Wed 14/12/11		
645	km 220+100	93.5 days	Mon 02/05/11	Wed 31/08/11		
646	od km 220+250 do 221-200	71.5 days	Fri 01/07/11	Fri 30/09/11		
647	od km 221+300 do 222-200	45.5 days	Sat 01/10/11	Wed 14/12/11		
648	od km 222+200 do 223-700	56.5 days	Sat 01/10/11	Wed 14/12/11		
649	od km 223+750 do 224-300	46.5 days	Thu 01/09/11	Sat 29/10/11		
650	od km 224+500 do 226-000	56.5 days	Sat 01/10/11	Wed 14/12/11		
651	od km 226+000 do 226+900	69.5 days	Thu 01/09/11	Wed 30/11/11		
652	od km 226+950 do 229+600	93.5 days	Mon 01/08/11	Wed 30/11/11		
653	budowa kanalizacji deszczowej	185.5 days	Fri 01/04/11	Wed 30/11/11		
654	od km 232-575 do 233-325	92 days	Fri 01/04/11	Sat 30/07/11		
655	od km 233+850 do 234-600	94.5 days	Wed 01/06/11	Fri 30/09/11		
656	od km 237+950 do 239-600	117 days	Fri 01/07/11	Wed 30/11/11		
657	od km 241+371 do 241+938	46.5 days	Thu 01/09/11	Sat 29/10/11		
658		46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
659		46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
660		46 days	Mon 02/05/11	Thu 30/06/11		
661		141 days	Mon 02/05/11	Mon 31/10/11		
662		141 days	Mon 02/05/11	Mon 31/10/11		
663		141 days	Mon 02/05/11	Mon 31/10/11		
664		95 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
665		71.5 days	Fri 01/07/11	Fri 30/09/11		
666		163 days	Mon 02/05/11	Wed 30/11/11		
667		163 days	Mon 02/05/11	Wed 30/11/11		
668		140 days	Wed 01/06/11	Wed 30/11/11		
669		93.5 days	Mon 02/05/11	Wed 31/08/11		
670		94.5 days	Wed 01/06/11	Fri 30/09/11		
671		95 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
672		95 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
673		92 days	Fri 01/07/11	Mon 31/10/11		
674		92 days	Fri 01/04/11	Sat 30/07/11		
675		46.5 days	Wed 01/06/11	Sat 30/07/11		
676		68.5 days	Fri 01/04/11	Thu 30/06/11		
677		82 days	Fri 01/04/11	Sat 30/07/11		
678		82 days	Fri 01/04/11	Sat 30/07/11		

Project: POSTĘP ROBÓT DO RAPOR
 Data: Mon 09/05/11

Task Critical Task

Progress Milestone

Summary Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress Split

External Tasks Project Summary

Group By Summary Deadline

Page 7

