


Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Wartość robót - narastająco
[zł netto]

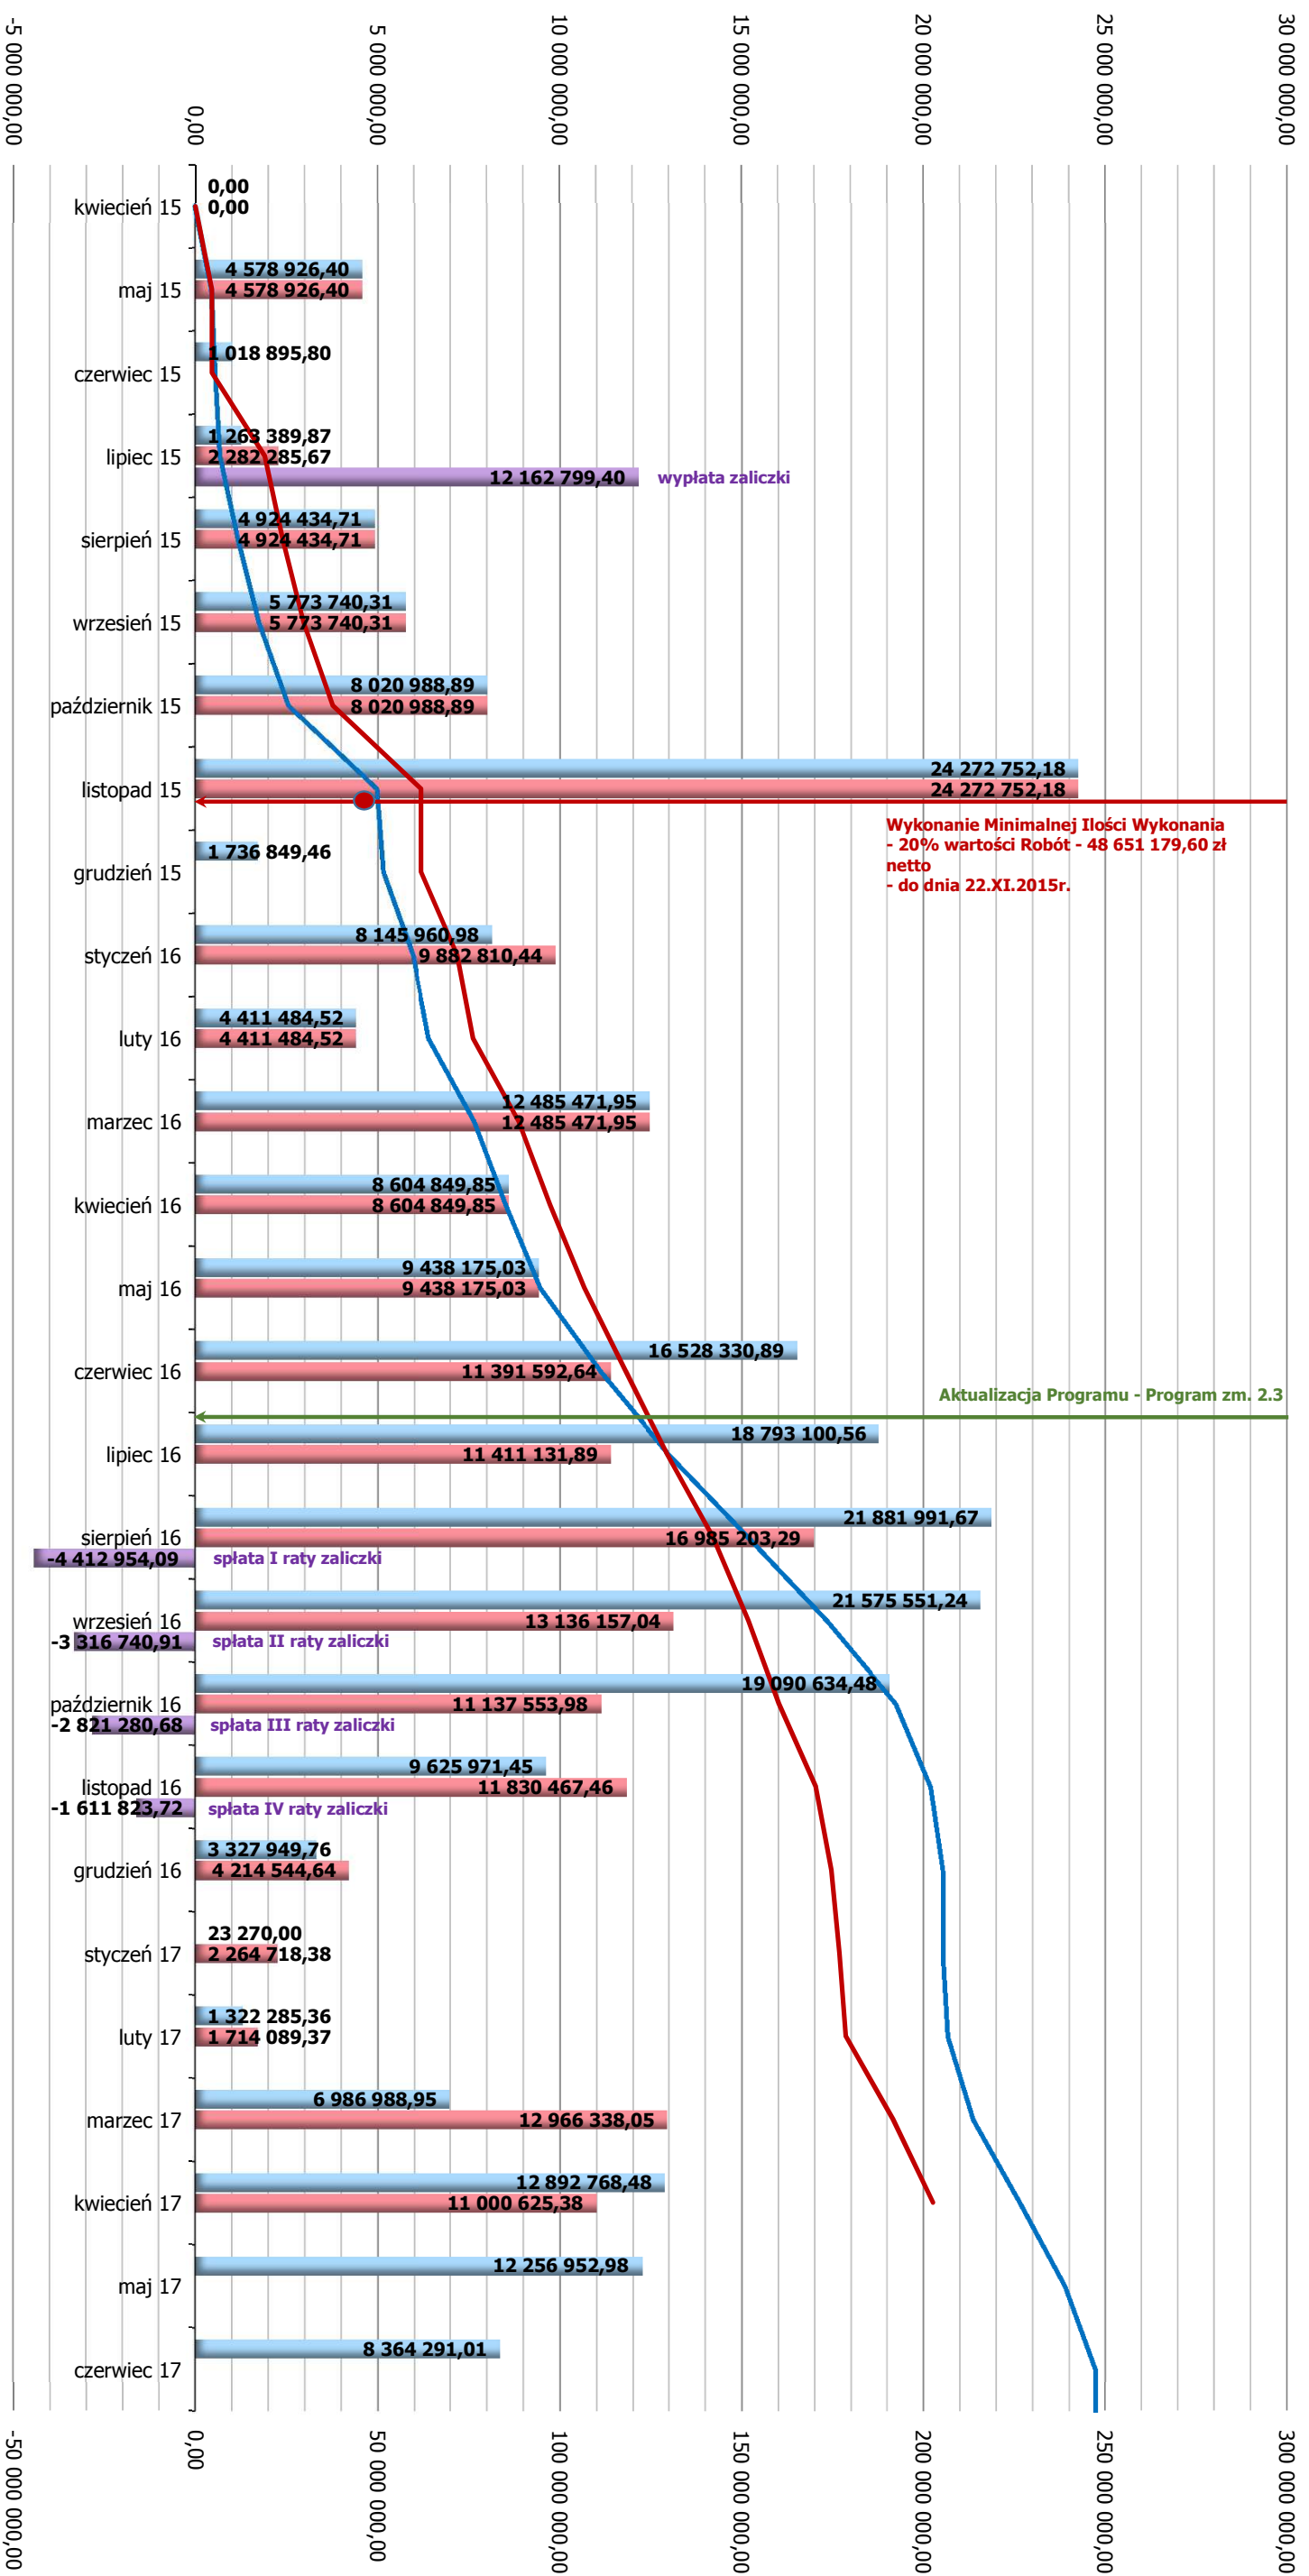

PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 zaakceptowanego 15.07.2015 - w miesiącu [zł netto]

WYKONANE - w miesiącu [zł netto]

wypłata/spłata zaliczki [zł netto]

PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 - narastająco [zł netto]

WYKONANE - narastająco [zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastająco" nie uwzględniał zaliczki.
Wykres "WYKONANIE - narastająco" uwzględnia zaliczkę.

Wykonanie Minimalnej Ilości Wykonania - 20% wartości Robót - 48 651 179,60 zł netto - do dnia 22.XI.2015r.

Aktualizacja Programu - Program zm. 2.3
