


Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Wartość robót - narastająco
[zł netto]

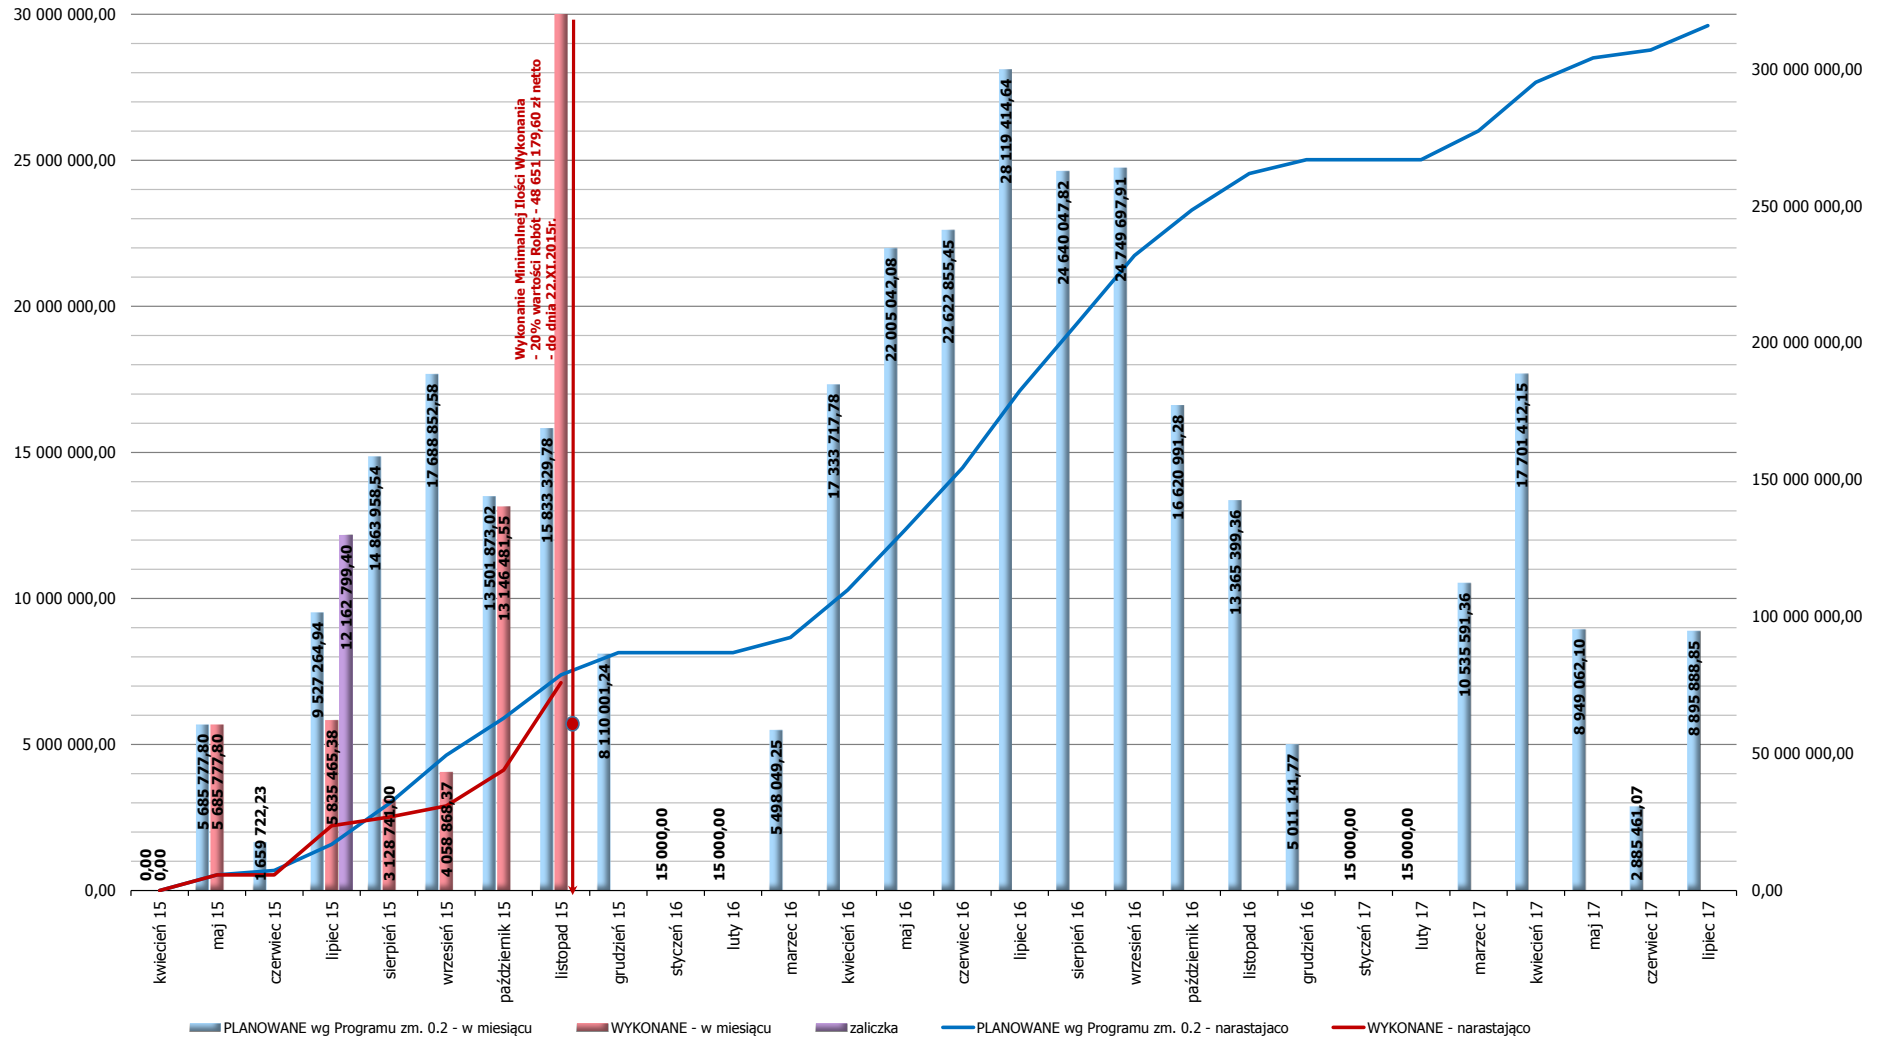

Uwaga: Wartość zaliczki nie wlicza się do wykresu "PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - narastająco"

Dane do wykresu
Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

	pśp	PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - w miesiącu	WYKONANE - w miesiącu	zaliczka	PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - narastająco	WYKONANE - narastająco
2015-04-01		0,00	0,00		0,00	0,00
2015-05-01	1	5 685 777,80	5 685 777,80		5 685 777,80	5 685 777,80
2015-06-01		1 659 722,23			7 345 500,03	5 685 777,80
2015-07-01	2	9 527 264,94	5 835 465,38	12 162 799,40	16 872 764,97	23 684 042,58
2015-08-01	3	14 863 958,54	3 128 741,00		31 736 723,51	26 812 783,58
2015-09-01	4	17 688 852,58	4 058 868,37		49 425 576,09	30 871 651,95
2015-10-01	5	13 501 873,02	13 146 481,55		62 927 449,11	44 018 133,50
2015-11-01	6	15 833 329,78	31 886 516,74		78 760 778,89	75 904 650,24
2015-12-01		8 110 001,24			86 870 780,13	
2016-01-01		15 000,00			86 885 780,13	
2016-02-01		15 000,00			86 900 780,13	
2016-03-01		5 498 049,25			92 398 829,38	
2016-04-01		17 333 717,78			109 732 547,16	
2016-05-01		22 005 042,08			131 737 589,24	
2016-06-01		22 622 855,45			154 360 444,69	
2016-07-01		28 119 414,64			182 479 859,33	
2016-08-01		24 640 047,82			207 119 907,15	
2016-09-01		24 749 697,91			231 869 605,06	
2016-10-01		16 620 991,28			248 490 596,34	
2016-11-01		13 365 399,36			261 855 995,70	
2016-12-01		5 011 141,77			266 867 137,47	
2017-01-01		15 000,00			266 882 137,47	
2017-02-01		15 000,00			266 897 137,47	
2017-03-01		10 535 591,36			277 432 728,83	
2017-04-01		17 701 412,15			295 134 140,98	
2017-05-01		8 949 062,10			304 083 203,08	
2017-06-01		2 885 461,07			306 968 664,15	
2017-07-01		8 895 888,85			315 864 553,00	
Razem:		315 864 553,00	75 904 650,24			
