


Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Wartość robót - narastająco
[zł netto]

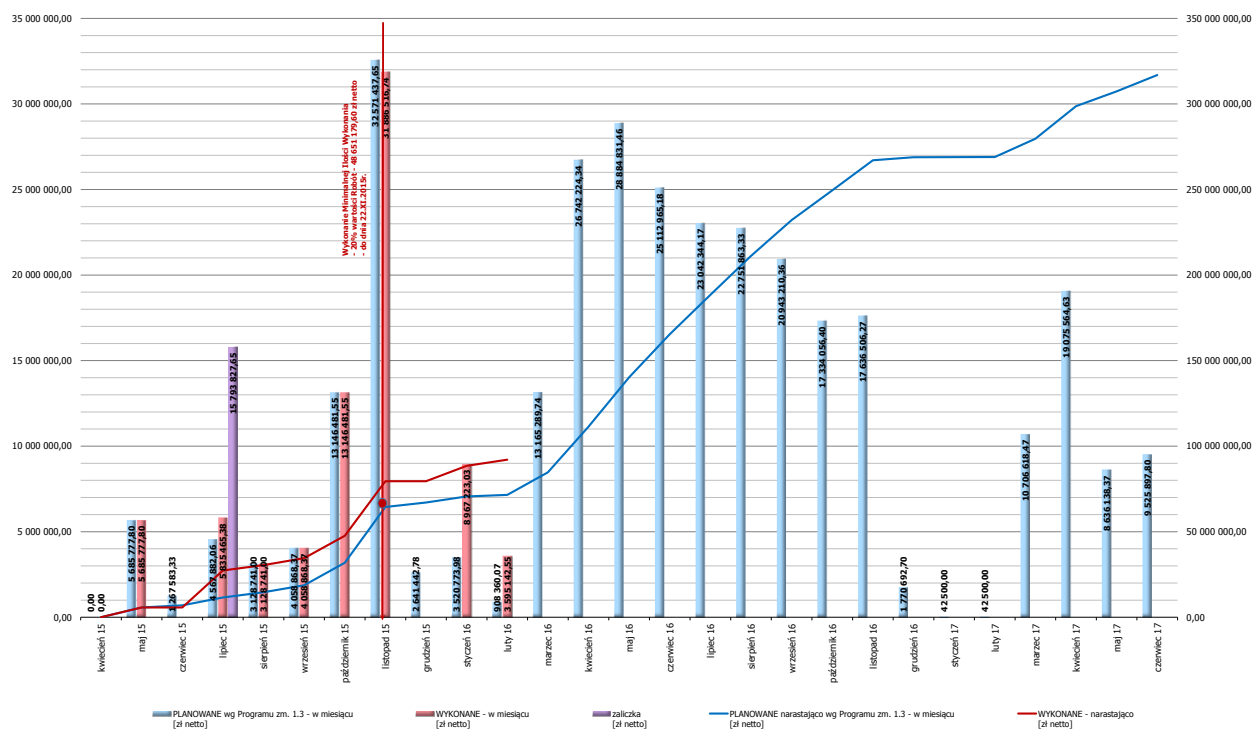

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastająco" nie uwzględnia zaliczki.
Wykres "WYKONANIE - narastająco" uwzględnia zaliczkę.

Dane do wykresu
 Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu

		PLANOWANE wg Programu am. 1.3 - w miesiącu (z netto)	WYKONANE - w miesiącu (z netto)	zaliczka (z netto)	PLANOWANE rozbieżność wg Programu am. 1.3 - w miesiącu (z netto)	WYKONANE rozbieżność (z netto)
2015-04-01		0,00	0,00		0,00	0,00
2015-05-01	1	5 685 777,80	5 685 777,80		5 685 777,80	5 685 777,80
2015-06-01	2	1 267 583,33			6 953 361,13	5 685 777,80
2015-07-01		4 567 882,06	5 835 465,38	15 793 827,65	11 521 243,19	27 315 070,83
2015-08-01	3	3 128 741,00	3 128 741,00		14 692 502,19	30 443 571,83
2015-09-01	4	4 058 868,37	4 058 868,37		18 751 370,56	34 502 680,20
2015-10-01	5	13 146 481,55	13 146 481,55		31 897 852,11	47 649 161,75
2015-11-01	6	32 571 437,65	31 886 516,74		64 436 771,76	79 535 678,49
2015-12-01	7	2 641 442,78			67 068 214,54	79 535 678,49
2016-01-01		3 520 773,98	8 967 223,03		70 588 988,52	88 502 901,52
2016-02-01	8	988 360,07	3 995 142,55		71 497 348,59	92 698 044,07
2016-03-01		13 463 289,74			84 660 638,33	
2016-04-01		35 743 228,34			111 404 862,67	
2016-05-01		28 884 831,46			140 289 694,13	
2016-06-01		25 112 965,18			165 402 659,31	
2016-07-01		23 042 344,17			188 445 003,48	
2016-08-01		22 761 863,33			211 196 866,81	
2016-09-01		20 943 210,36			232 140 077,17	
2016-10-01		17 314 056,40			249 474 133,57	
2016-11-01		17 636 506,27			267 110 639,84	
2016-12-01		1 770 692,70			268 881 332,54	
2017-01-01		42 500,00			268 923 832,54	
2017-02-01		42 500,00			268 966 332,54	
2017-03-01		10 706 618,47			279 672 951,01	
2017-04-01		19 873 564,63			298 748 515,64	
2017-05-01		8 638 138,37			307 384 654,01	
2017-06-01		9 525 897,80			316 910 551,81	
2017-07-01						
Razem:		316 910 551,81	92 098 044,07			
