STRABAG

KIRCHNER





Roboty ziemne	jedn.	ilość	Kilometraż Ł nr 0	Ł nr 1
Nasyp	m3	44136		
Wykop	m3	5036		
Odhumusowanie	m3	9714		

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł nr 0	Ł nr 1
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	1791		
Grunt stab. cem. 20cm-podłoże nasypu	m2	380		
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	3105		
Grunt stab. cem. 20cm-pod konstrukcją	m2	2870		
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	5275		
Warstwa mrozoochronna gr. 25cm	m3	1676		
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	1588		
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	1195		
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	7592		
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 12cm	m2	7201		
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	7096		
W-wa ścieralna SMA gr. 4cm	m2	6992		

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł nr 0	Ł nr 1
Rekultywacja terenu	m2	2720		
Humusowanie i obsiew	m2	24527		

Plan liniowy:

Węzeł Małdyty

STRABAG

KIRCHNER

Łącznica nr 2

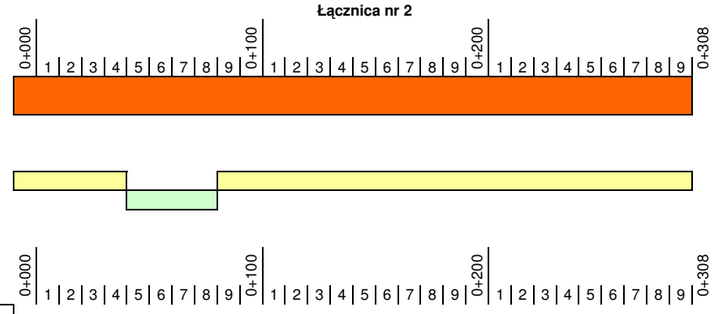

Łącznica nr 3

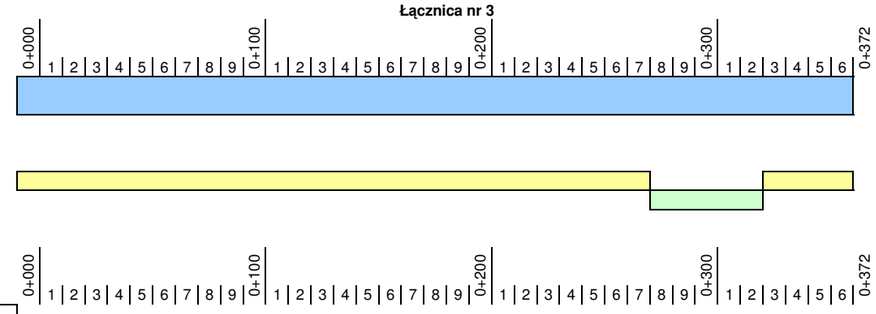

Roboty ziemne	jedn.	ilość	Ł nr 2	Ł nr 3
Nasyp	m3	44136		
Wykop	m3	5036		
Odhumusowanie	m3	9714		

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł nr 2	Ł nr 3
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	1791		
Grunt stab. cem. 20cm-podłoże nasypu	m2	380		
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	3105		
Grunt stab. cem. 20cm-pod konstrukcją	m2	2870		
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	5275		
Warstwa mrozoochronna gr. 25cm	m3	1676		
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	1588		
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	1195		
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	7592		
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 12cm	m2	7201		
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	7096		
W-wa ścieralna SMA gr. 4cm	m2	6992		

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł nr 2	Ł nr 3
Rekultywacja terenu	m2	2720		
Humusowanie i obsiew	m2	24527		

Plan liniowy:

Węzeł Małdyty

Legenda:

element:	znaczenie:
	wykonane niesprzedane
	wykonane częściowo sprzedane
1	wykonane sprzedane
