STRABAG

KIRCHNER

Łącznica nr 1



Łacznica nr 2







Roboty ziemne	jedn.	ilość	Kilometraż Ł nr 1	Ł nr 2
Nasyp	m3	47990		
Wykop	m3	9216		
Odhumusowanie	m3	10760		
Wzmocnienie podłoża pod nasypy	m2			

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł nr 1	Ł nr 2
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	2929		
Pospółka gr. 30cm	m2	14190		
Grunt stab. cementem gr 25cm	m2	12670		
Warstwa mrozoochronna gr. 25cm	m3	272		
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	5761		
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	2705		
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	7681		
Podbudowa zasadnicza z BA 14cm	m2	6092		
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	5973		
W-wa ścieralna SMA gr. 4cm	m2	5908		

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł nr 1	Ł nr 2
Humusowanie i obsiew	m2	17397		
Kaskada betonowa	mb	50		
Ściek korytkowy	mb	956		
Ściek trójkątny	mb	819		

Plan liniowy:

Węzeł Pasłęk Południe

STRABAG

KIRCHNER

Łącznica nr 3

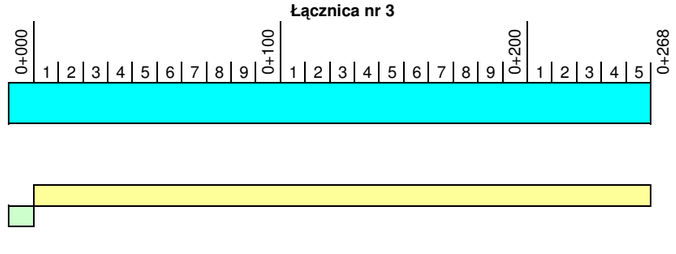

Łącznica nr 4

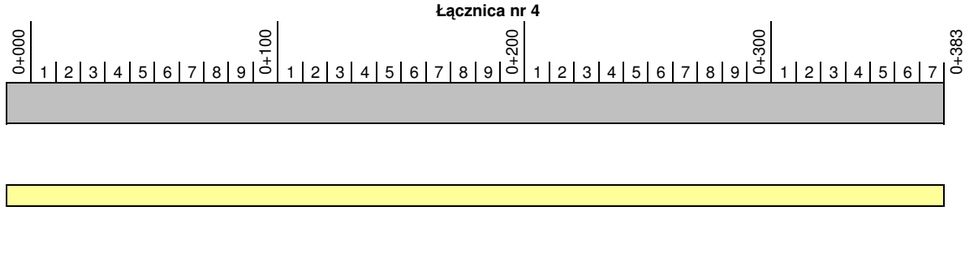

Roboty ziemne	jedn.	ilość	Ł nr 3
Nasyp	m3	47990	
Wykop	m3	9216	
Odhumusowanie	m3	10760	
Wzmocnienie podłoża pod nasypy	m2		

Ł nr 4

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł nr 3
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	2929	
Pospółka gr. 30cm	m2	14190	
Grunt stab. cementem gr 25cm	m2	12670	
Warstwa mrozoochronna gr. 25cm	m3	272	
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	5761	
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	2705	
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	7681	
Podbudowa zasadnicza z BA 14cm	m2	6092	
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	5973	
W-wa ścieralna SMA gr. 4cm	m2	5908	

Ł nr 4

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł nr 3
Humusowanie i obsiew	m2	17397	
Kaskada betonowa	mb	50	
Ściek korytkowy	mb	956	
Ściek trójkątny	mb	819	

Ł nr 4

Plan liniowy:

Węzeł Pasłęk Południe

Legenda:

element:	znaczenie:
	wykonane niesprzedane
	wykonane częściowo sprzedane
1	wykonane sprzedane
