Graficzna prezentacja postępu finansowego w porównaniu do Programu / S7

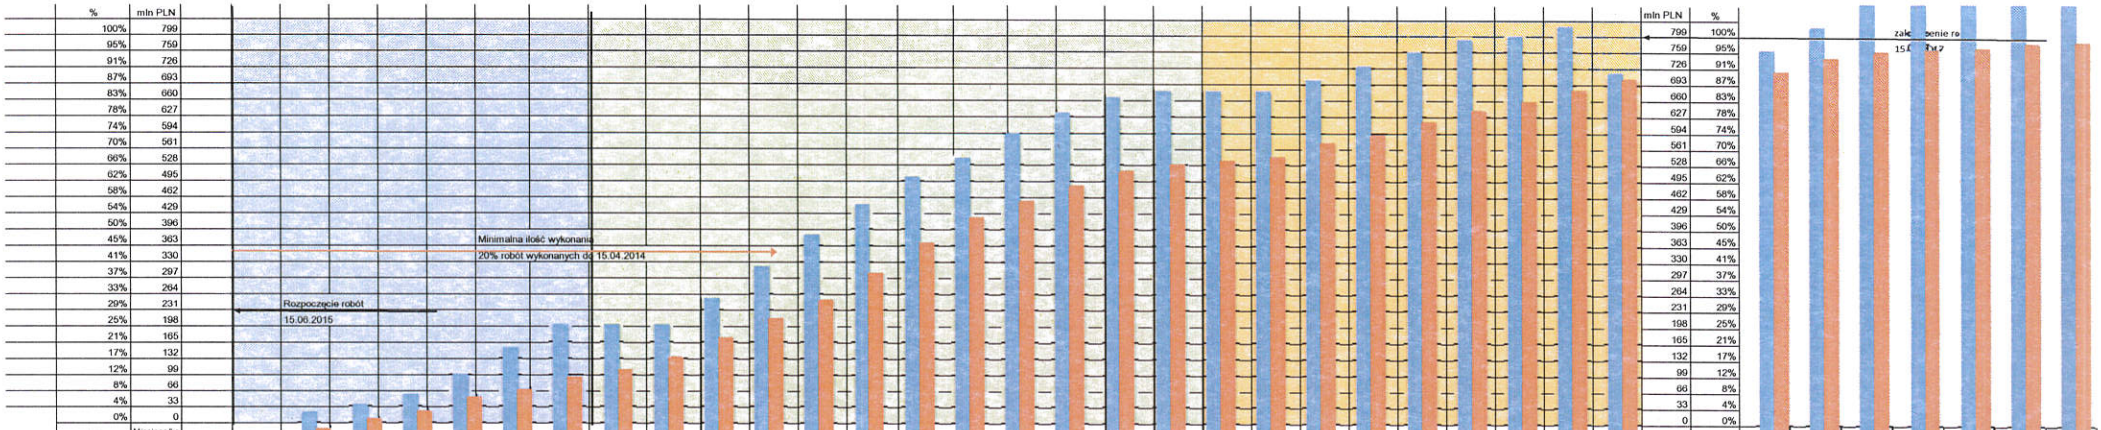

%	mln PLN
100%	799
95%	759
91%	726
87%	693
83%	660
78%	627
74%	594
70%	561
66%	528
62%	495
58%	462
54%	429
50%	396
45%	363
41%	330
37%	297
33%	264
29%	231
25%	198
21%	165
17%	132
12%	99
8%	66
4%	33
0%	0

Mln PLN	Miesiąc/kontrakt	nr PŚP	[PLN netto] Wykonanie wg PŚP	[PLN netto] Narastająco wg PŚP	[PLN netto] w Miesiącu	[PLN] Narastająco wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto)
	15 VI 2015	1	10 529 534,46	10 529 534,46	10 533 747,96	10 533 747,96
	VII 2015	2	18 431 080,76	28 960 615,22	49 122 371,88	59 656 119,84
	VIII 2015	3	17 935 562,93	46 896 178,15	14 271 359,92	73 927 479,76
	IX 2015	4	14 980 921,20	61 877 099,35	20 070 148,34	93 997 628,10
	X 2015	5	26 959 271,13	88 836 370,48	39 200 388,26	133 198 016,36
	XI 2015	6	15 634 024,59	104 470 395,07	50 995 442,28	184 193 458,64
	XII 2015	7	23 769 423,85	128 239 818,92	43 478 737,07	227 672 195,71
	I 2016	8	14 337 687,82	142 577 506,74	1 515,72	227 673 711,43
	II 2016	9	23 383 259,30	165 960 766,04	1 515,72	227 675 227,15
	III 2016	10	36 539 852,69	202 500 618,73	50 130 074,57	277 805 301,72
	IV 2016	11	36 967 754,09	239 468 372,82	60 943 651,39	338 748 953,11
	V 2016	12	35 256 923,27	274 725 296,09	60 038 834,50	398 787 787,61
	VI 2016	13	52 303 046,27	327 028 342,36	56 869 613,32	455 657 400,93
	VII 2016	14	57 762 429,36	384 790 771,72	53 455 904,44	509 113 305,37
	VIII 2016	15*	47 160 514,15	431 951 285,87	38 041 520,99	547 154 826,36
	IX 2016	16*	30 910 155,12	462 861 440,99	46 101 765,35	593 256 591,71
	X 2016	17*	29 562 819,39	492 424 260,38	39 354 836,63	632 611 428,34
	XI 2016	18*	29 110 093,38	521 534 353,76	28 664 830,80	661 276 259,14
	XII 2016	19*	12 556 699,95	534 091 053,71	14 001 911,68	675 278 170,82
	I 2017	20	7 561 706,70	541 652 760,41	1 515,72	675 279 686,54
	II 2017	21	7 387 320,22	549 040 080,63	1 515,72	675 281 202,26
	III 2017	22	25 639 193,75	574 679 274,38	21 705 422,09	696 986 624,35
	IV 2017	23	17 055 873,16	591 735 147,54	24 586 358,18	721 572 982,53
	V 2017	24	24 766 335,32	616 501 483,86	27 342 246,75	748 915 229,28
	VI 2017	25	20 579 227,42	637 080 711,28	23 554 107,50	772 469 336,78
	VII 2017	26	18 571 379,10	655 652 090,38	6 918 757,63	779 388 094,41
	15 VIII 2017	27	20 890 194,25	676 542 284,63	20 529 312,15	799 917 406,58
	15 IX 2017	28	21 014 253,75	697 556 538,38	33 610 778,21	710 153 062,83
	X 2017	29*	15 526 738,87	713 083 277,25	43 060 078,45	753 213 141,28
	XI 2017	30*	27 515 898,96	740 599 176,21	45 757 070,80	798 970 212,08
	XII 2017	31*	9 848 804,58	750 447 980,79	44 643 544,10	843 613 756,19
	I 2018	32*	5 392 757,48	755 840 738,27	0,00	843 613 756,19
	II 2018	33*	2 681 540,70	758 522 278,97	0,00	843 613 756,19
	III 2018	34*	8 895 004,09	767 417 283,06	0,00	843 613 756,19
	IV 2018	35*	4 194 582,27	771 611 865,33	0,00	843 613 756,19

W dniu 04.08.2015 został zatwierdzony Program zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

Legenda

wartość wykonania i narastająco wg PŚP (netto)

wartość zaplanowania i narastająco wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto)

rok 2015

rok 2016

rok 2017

* **PŚP uwzględniające spłatę zaliczki**
